

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 04/05/2018

Inspecteur: Michael Van den Eynde Mentor:

Installateur: DJ DARKLIGHT

ID-label:

B.T.W. nr.: BE 0536.808.688

IK, nr.:-

Merk en type meettoestel: Metrel
Eurotest ET61557

Serie Nr.: 17470084

Plaats van het onderzoek:

Straatnaam KANUNNIK VAN TICHELENLAAN
Huisnummer 22
Postcode 2940
Gemeente STABROEK
Type woning

Eigenaar:

Naam Torfs
Straatnaam KANUNNIK VAN TICHELENLAAN
Huisnummer 22
Postcode 2940
Gemeente STABROEK

EAN : 54

Teller Nr.: 33750708

Aard onderzoek: Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens AREI artikels 271, 271bis en 86.

Netbeheerder: INFRAX Spanning: 1-230V Meter / bord verbinding: 10 mm² Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 1 Aantal kringen: 14 Isolatie: 0,835 MΩ

Aardelektrode: Aardingslus pen weerstand: 5,44 Ω

DIFFERENTIEELSCHAKELAAR

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I _{st}	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	14	ok	ok
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	7	ok	ok

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm ²)
3	C	16		2	-
10	C	20		2	-
1	C	25		2	-

Visueel nazicht
(algemeen)☒ OK☐ NOK

Directe aanraking

☒ OK☐ NOK

Indirecte aanraking

☒ OK☐ NOK

Aansluitingen

☒ OK☐ NOK

Correcte schema's

☒ OK☐ NOKschema in bijlage door Aceg vzw ☐Equipotentiale
verbindingen☒ OK☐ NOK☐ niet van toepassing ☐ in afwachting

Continuïteit

☒ OK☐ NOK

Verlichting / toestellen

☐ OK☐ NOK☒ NVT

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

O2 Geen inbreuken vastgesteld.

Nota: Pv-installatie niet mee opgenomen in dit verslag.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI. De volgende periodieke keuring is te voorzien voor 4/5/2043
- ☐ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) ééndraads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.
- ☐ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.
- ☐ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het AREI, moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte. De gegevens van de nieuwe eigenaar worden ons bezorgd na het verlijden van de akte. Indien de herkeuring gebeurt door een ander erkend organisme, dient deze ons hiervan op de hoogte te brengen.



Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 2

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Michael Van den Eynde

Van den Eynde Michael

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de FOD economie, KMO, middenstand en Energie – algemene directie energie, afdeling gas – elektriciteit

Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


www.aceg.be


02 / 880.88.90

BE06 7340 3288 4322 - BTW BE0839 866 481

Stappenplan voor een installatie die conform is:

Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Indien u belangrijke uitbreidingen doet aan uw installatie, laat opnieuw keuren	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 4/5/2043	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.

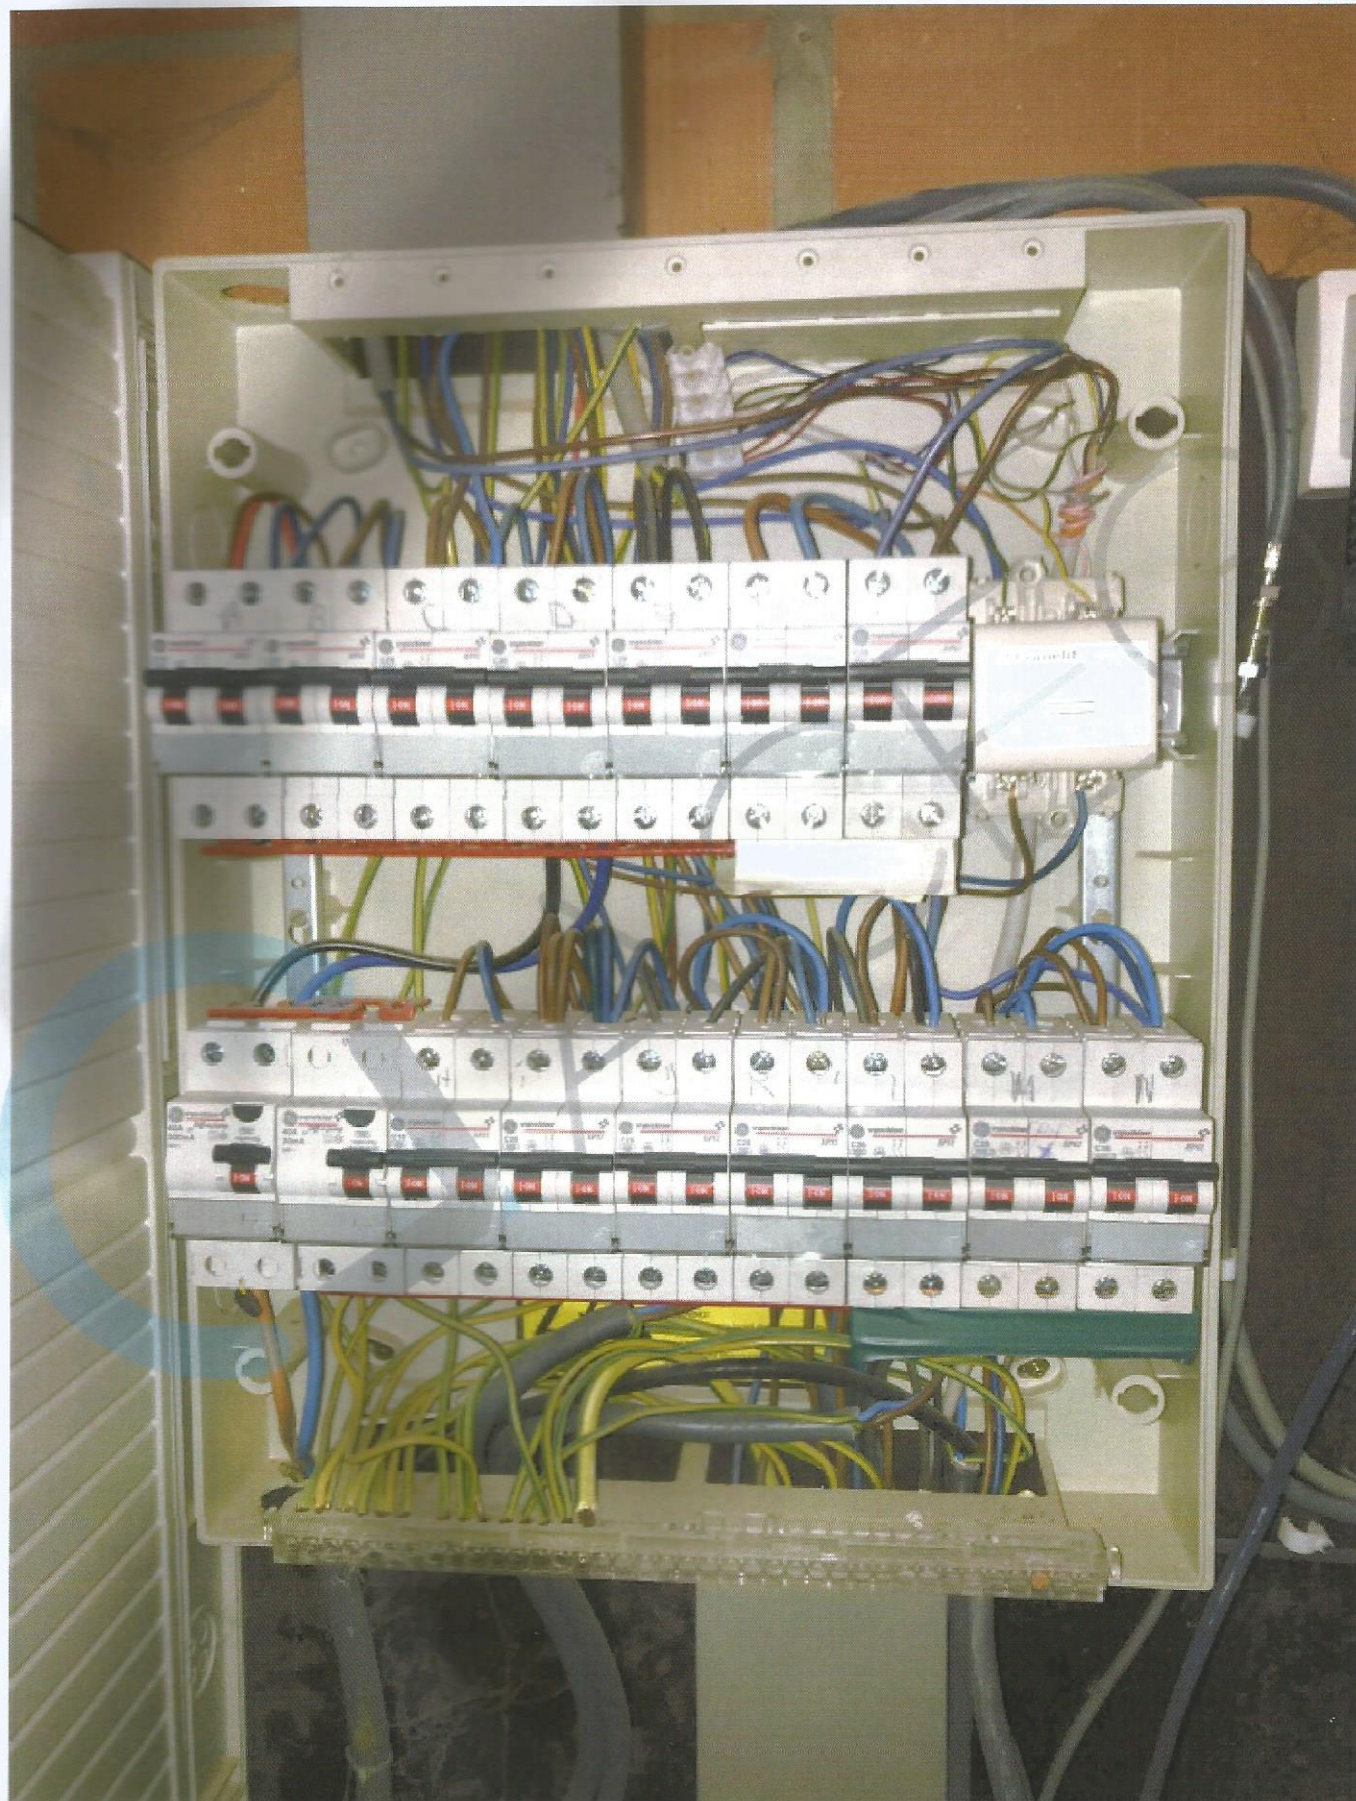


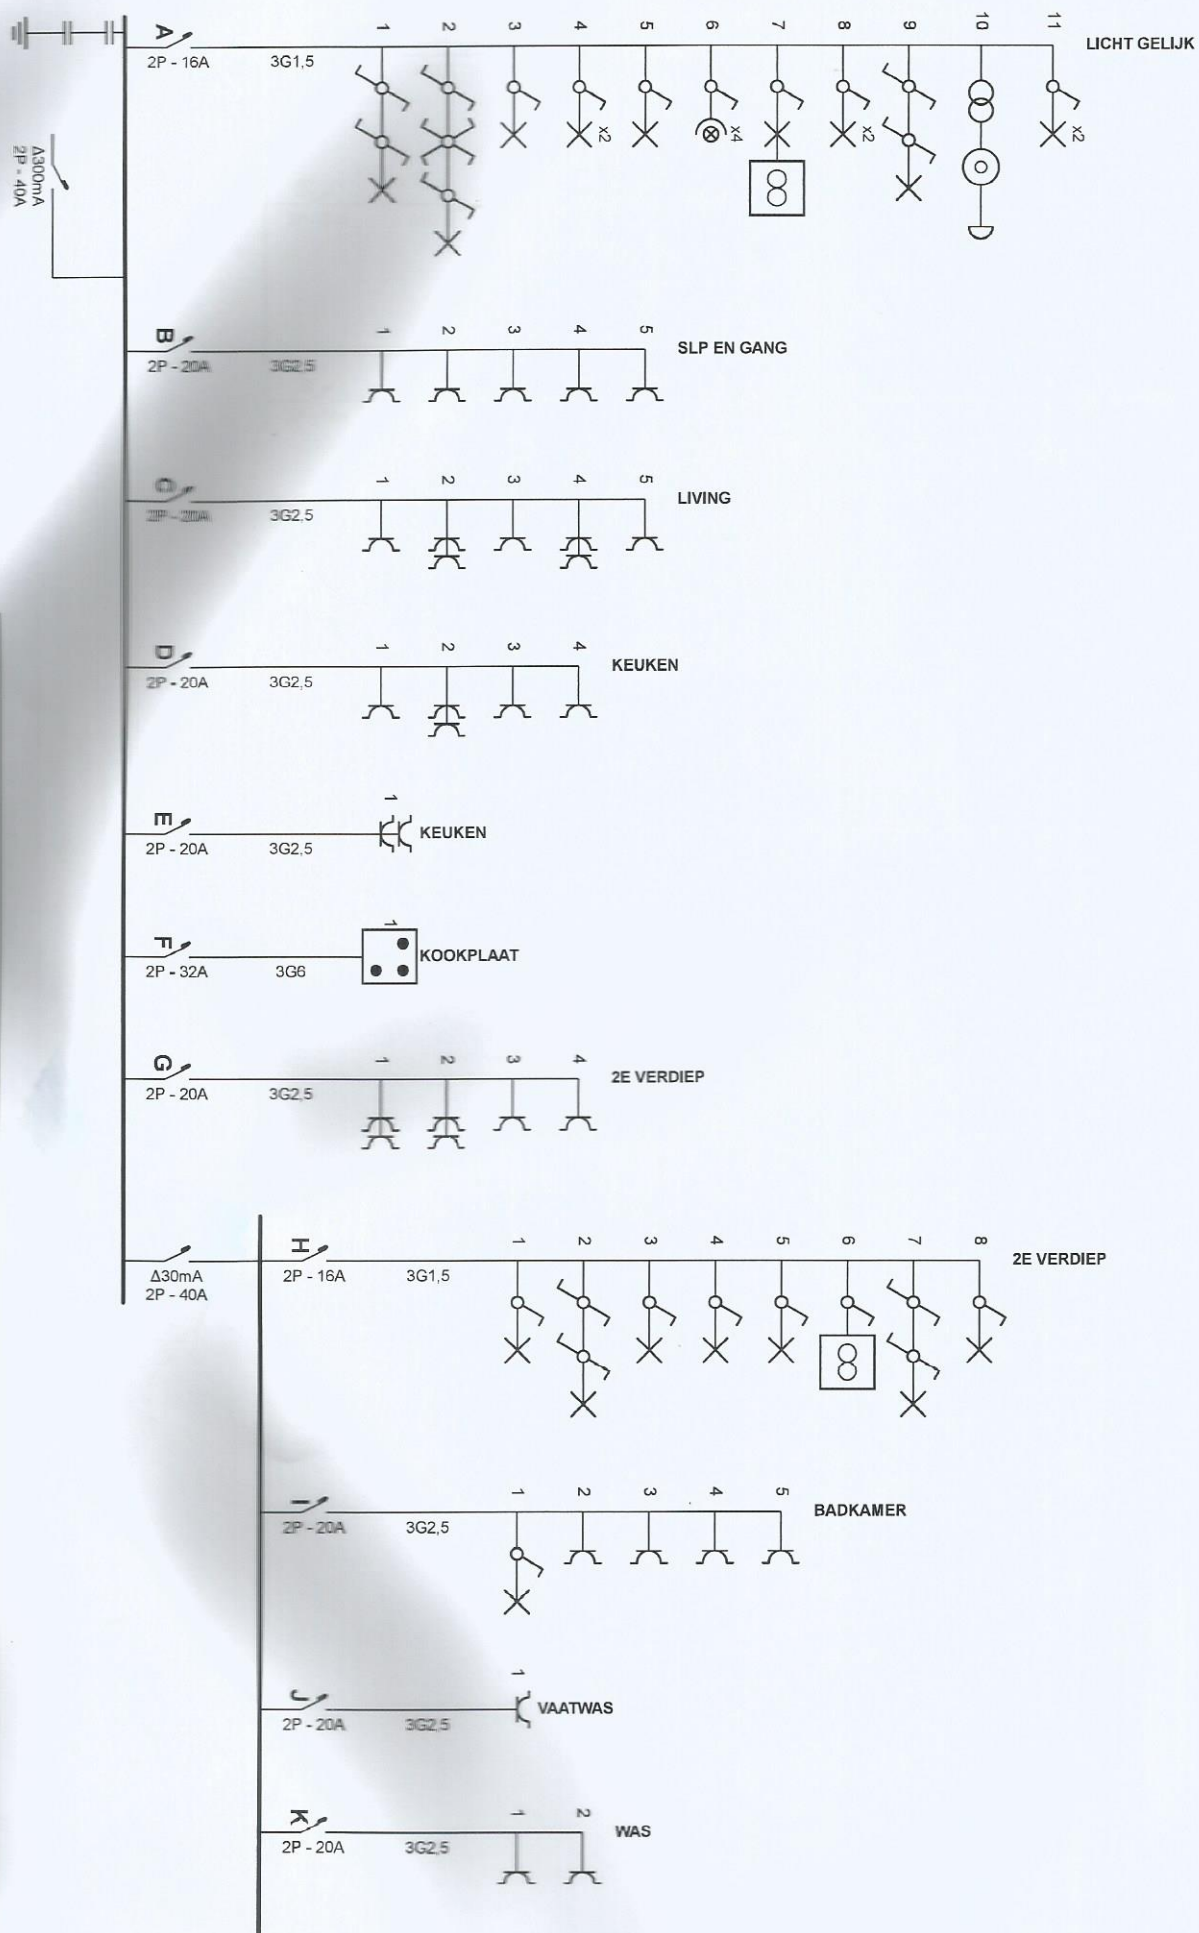

Plaats van de elektrische installatie
 toets
 karunuk van tichelenlaan 22
 STABROEK

Installateur
 PSC Electro B.V.B.A.
 Bloemenlaan 31
 2950 Kapellen
 GSM: 0477 45 42 49
 e-mail: info@pscselectro.com
 BTW BE 0808.390.179


P. 1/7
Eendraadschema
 Datum: 13/04/2018
 2 x 230V ~ 50Hz

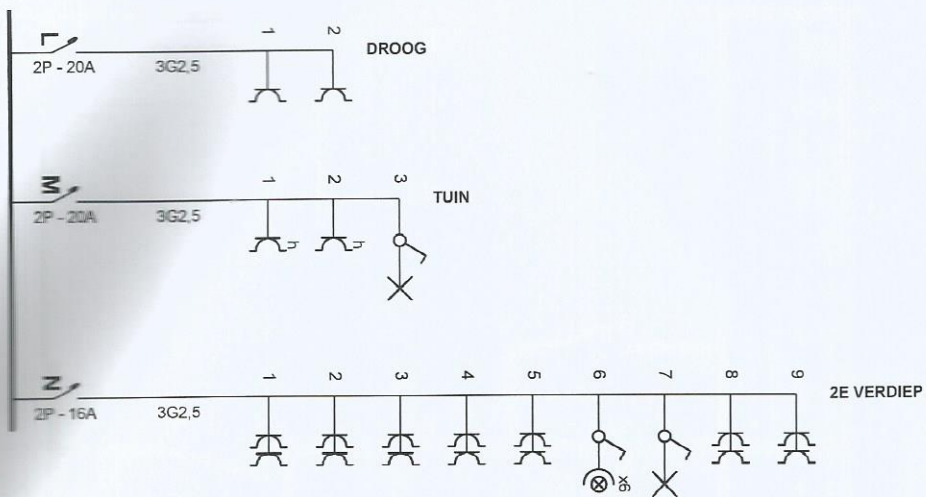

Plaats van de elektrische installatie
 100%
 Kamuniek van Hichelenlaan 22
 STABROEK

Installateur
 PSC Electro B.V.B.A.
 Bloemenlaan 31
 2950 Kapellen
 GSM: 0477 45 42 49
 e-mail: info@pscselectro.com
 BTW BE 0808.390.179


P. 2/7
 Eindraadschema
 Datum: 13/04/2018
 2 x 230V ~ 50Hz

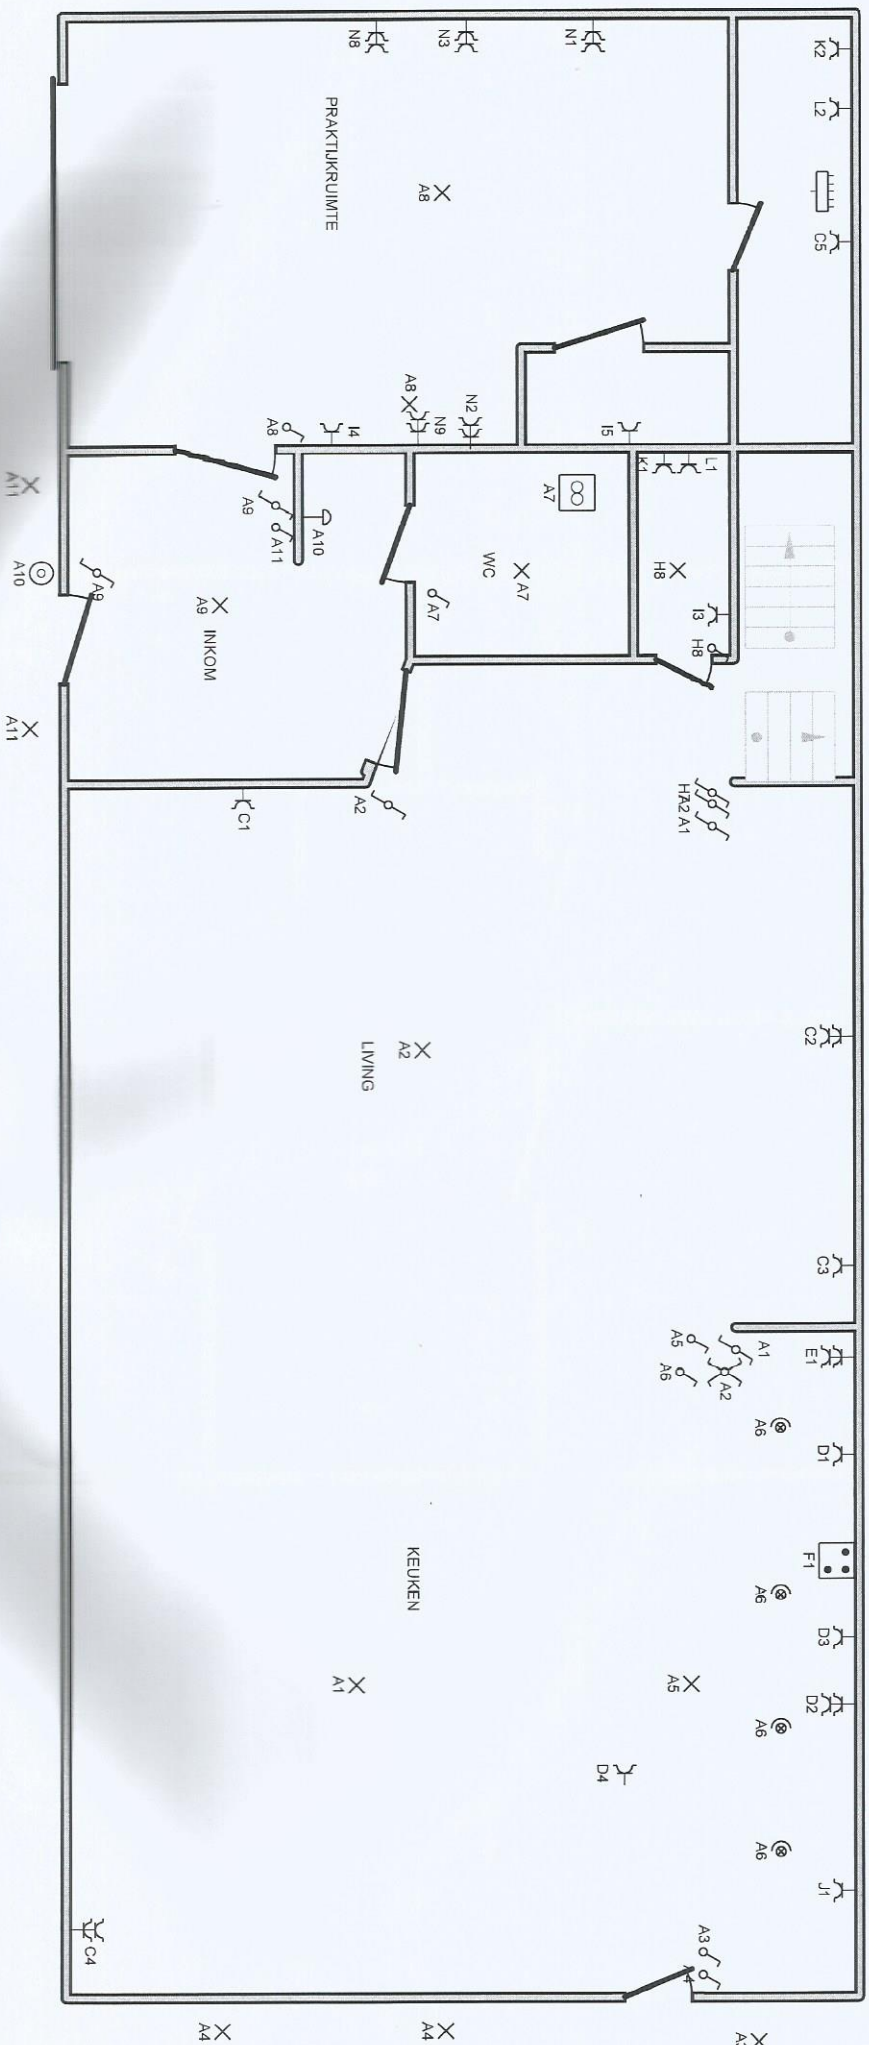

Plaats van de elektrische installatie
toets
kanuniek van tichelenlaan 22
STABROEK

Installateur
PSC Electro B.V.B.A.
Bloemenlaan 31
2950 Kapellen
GSM: 0477 45 42 49
e-mail: info@pscelectro.com
BTW BE 0808.390.179

p. 317
Situatieschema
Datum: 13/04/2018
2 x 230V ~ 50Hz

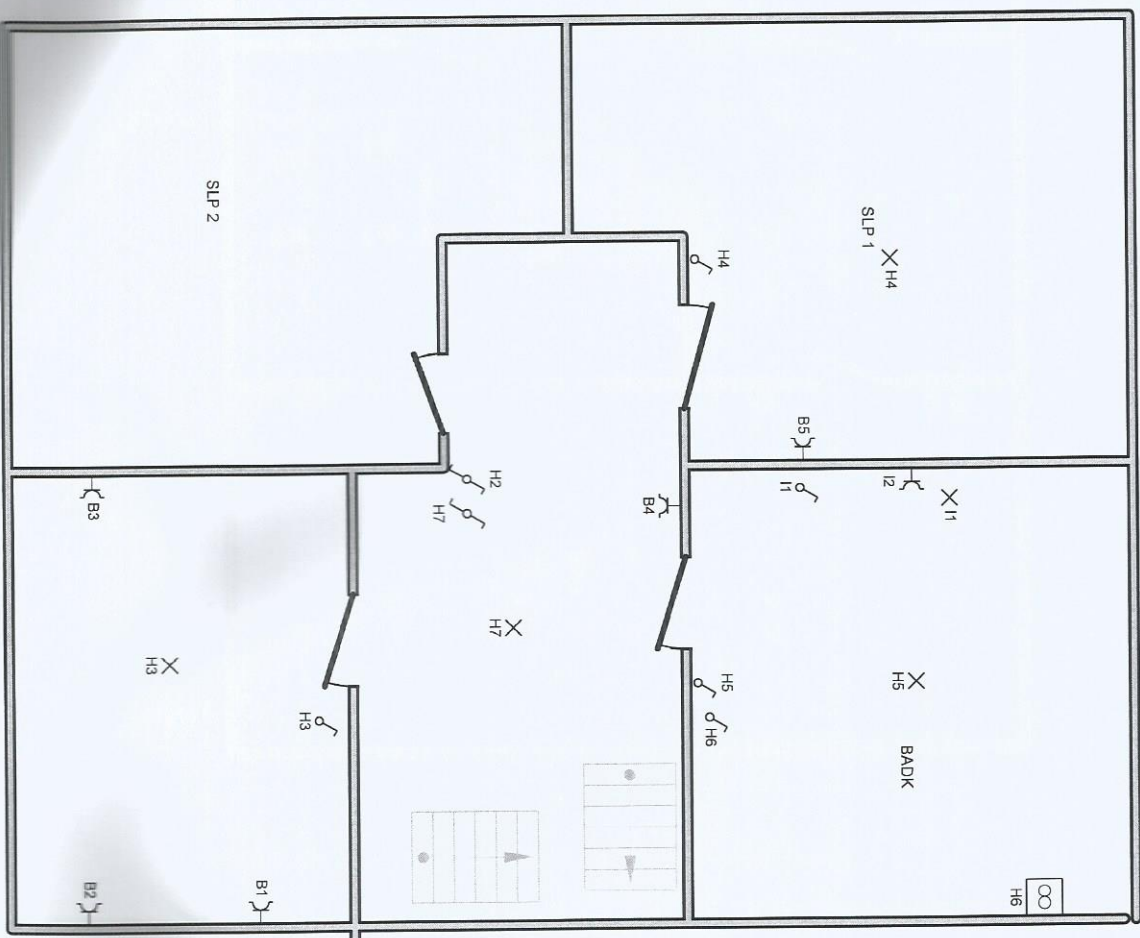


1STE VERDIEP

Plaats van de elektrische installatie
toets
kenmerk van tichelenlaan 22
STABROEK

Installateur
PSC Electro B.V.B.A.
Bloemenlaan 31
2950 Kapellen
GSM: 0477 45 42 49
e-mail: info@pselectro.com
BTW BE 0808.390.179

p. 4/7
Situatieschema
Datum: 13/04/2018
2 x 230V ~ 50Hz

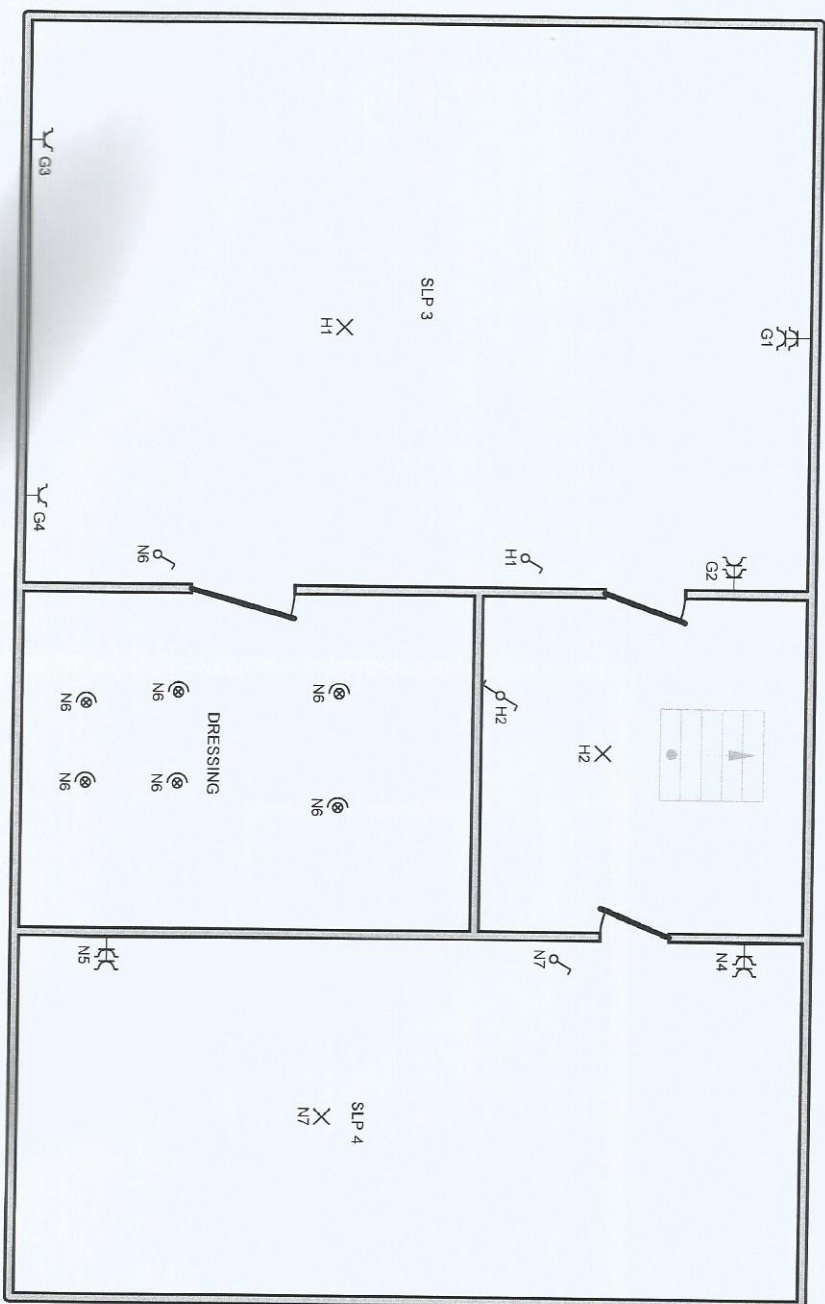

2E VERDIEP


Plaats van de elektrische installatie
 Dorfs
 kanunnik van tichelenlaan 22
 STABROEK

Installateur
 PSC Electro B.V.B.A.
 Bloemenlaan 31
 2950 Kapellen
 GSM: 0477 45 42 49
 e-mail: info@pselectro.com
 BTW BE 0808.390.179

P. 6/7
 Situatieschema
 Datum: 13/04/2019
 2 x 230V = 50Hz

Telcel

TUIN

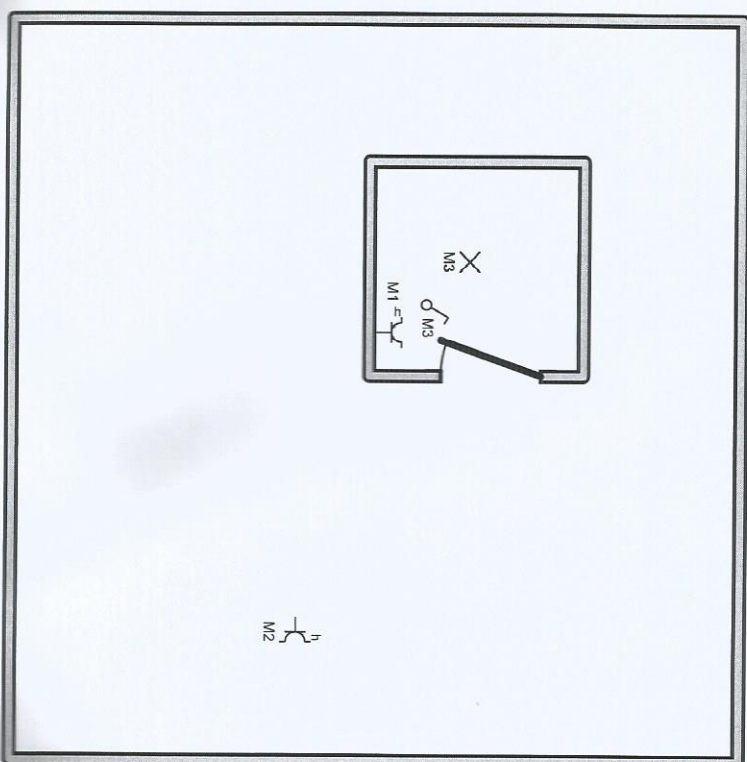

Plaats van de elektrische installatie
toets
kanuniek van tichelenlaan 22
STABROEK

Installateur
PSC Electro B.V.B.A.
Bloemenlaan 31
2950 Kapellen
GSM: 0477 45 42 49
e-mail: info@pscselectro.com
BTW BE 0808.390.179

p. 6/7
Situatieschema
Datum: 13/04/2018
2 x 230V ~ 50Hz

- A LICHT GELUK
- B SLP EN GANG
- C LIVING
- D KEUKEN
- E KEUKEN
- F KOOKPLAAT
- G 2E VERDIEP
- H 2E VERDIEP
- I BADKAMER
- J VAATWAS
- K WAS
- L DROOG
- M TUIN
- N 2E VERDIEP

Plaats van de elektrische installatie
 tofs
 kanunnik van tichelenlaan 22
 STABROEK

Installateur
 PSC Electro B.V.B.A.
 Bloemenlaan 31
 2950 Kapellen
 GSM: 0477 45 42 49
 e-mail: info@pscselectro.com
 BTW BE 0808.390.179

p. 7/7
Lijst Kringen
 Datum: 13/04/2018
 2 x 230V ~ 50Hz
