



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be



Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 22/11/2024 Inspecteur: Yoshi Van den Eynden Mentor: - Installateur: Elik Elektriciteitswerken BV
ID-label: - B.T.W. nr.: BE 0755 412 442 Klantreferentie: -

Merk en type meettoestel: Metrel
ET61557

Serienummer: 19481297

Datum verslag: 22/11/2024

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Berkenlaan
Huisnummer 99
Busnummer V1L
Postcode 2940
Gemeente Hoevenen
Land België

Eigenaar

Naam Semeels
Straatnaam Berkenlaan
Huisnummer 99
Busnummer V1L
Postcode 2940
Gemeente Hoevenen
Land België

Installateur


Naam Elik Elektriciteitswerken BV
BTW nr. BE 0755 412 442
Telefoonnummer 0483058803
E-mail Jeroen@elik.be

Type : appartement

EAN : 541448820048507293

Teller Nr.: : 1LGZ0470623193

Afbeelding schakel- en verdeelbord:

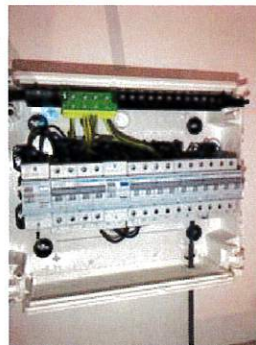

Aard onderzoek:

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 4.2.4.3.

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 1N400V

Meter / bord verbinding: 10 mm

Max beveiliging: 63 A

Aantal borden: 1

Aantal kringen: 7


Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders

Ri algemeen: 2.88 MΩ

RE: 16.95 Ω

OK

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

I _Δ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I _{Δt}	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	7	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	5	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
4	C	16		2	2,5
1	C	16		2	1,5
1	C	25		2	4
1	C	32		2	10

Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	OK		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

nota/note 2 Geen inbreuken vastgesteld.

nota/note 4 De controle omvat enkel het woongedeelte van het pand.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 22/11/2049
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 09:35 tot 10:11

De inspecteur Yoshi Van den Eynden

Yoshi Van den Eynden

ACEG VZW #412

Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechte of onrechte, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit


De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorgaan en de aanvrager.


De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be


BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481


Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 22/11/2049	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.

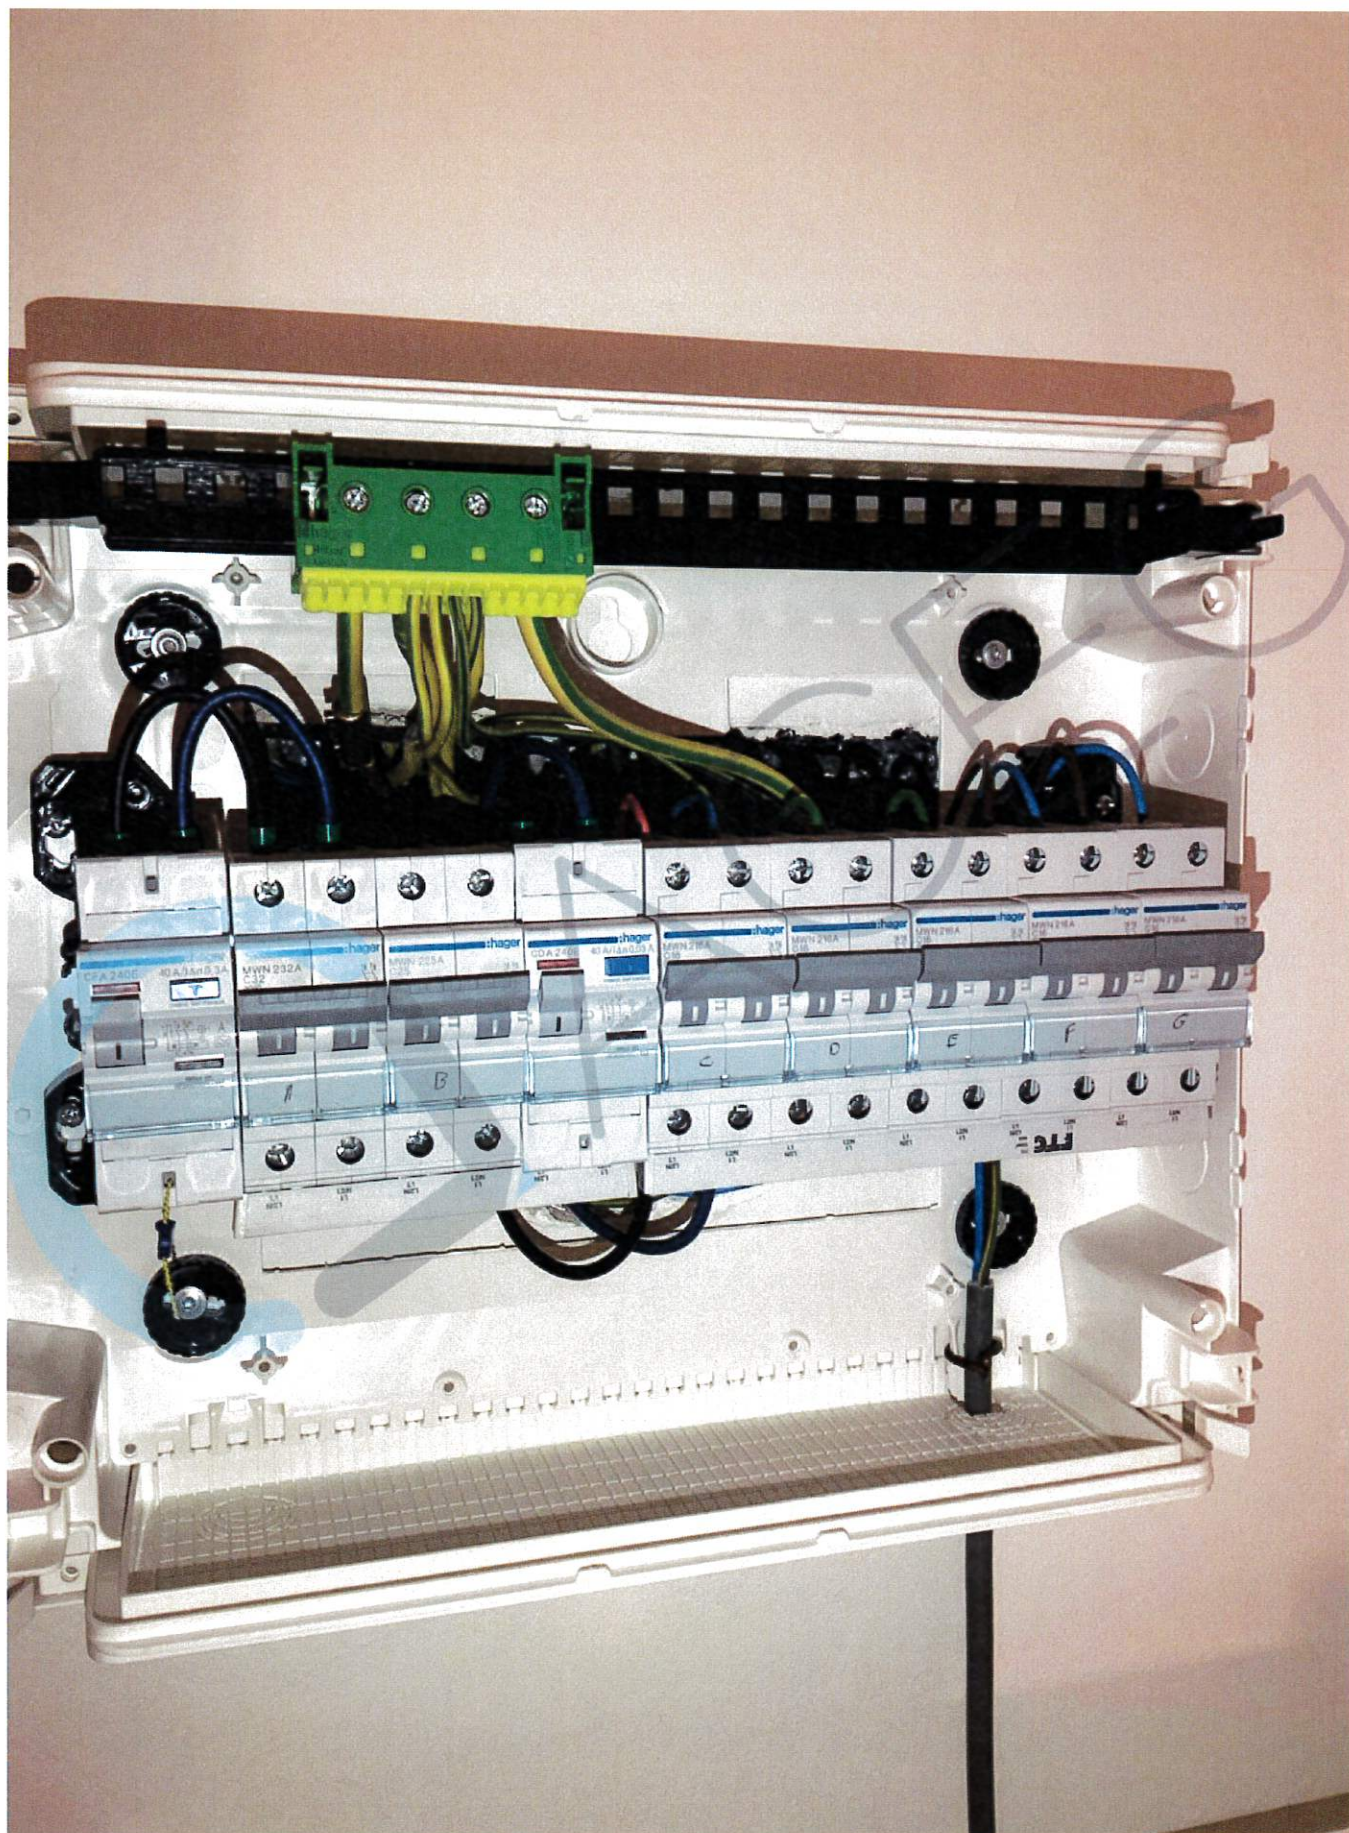


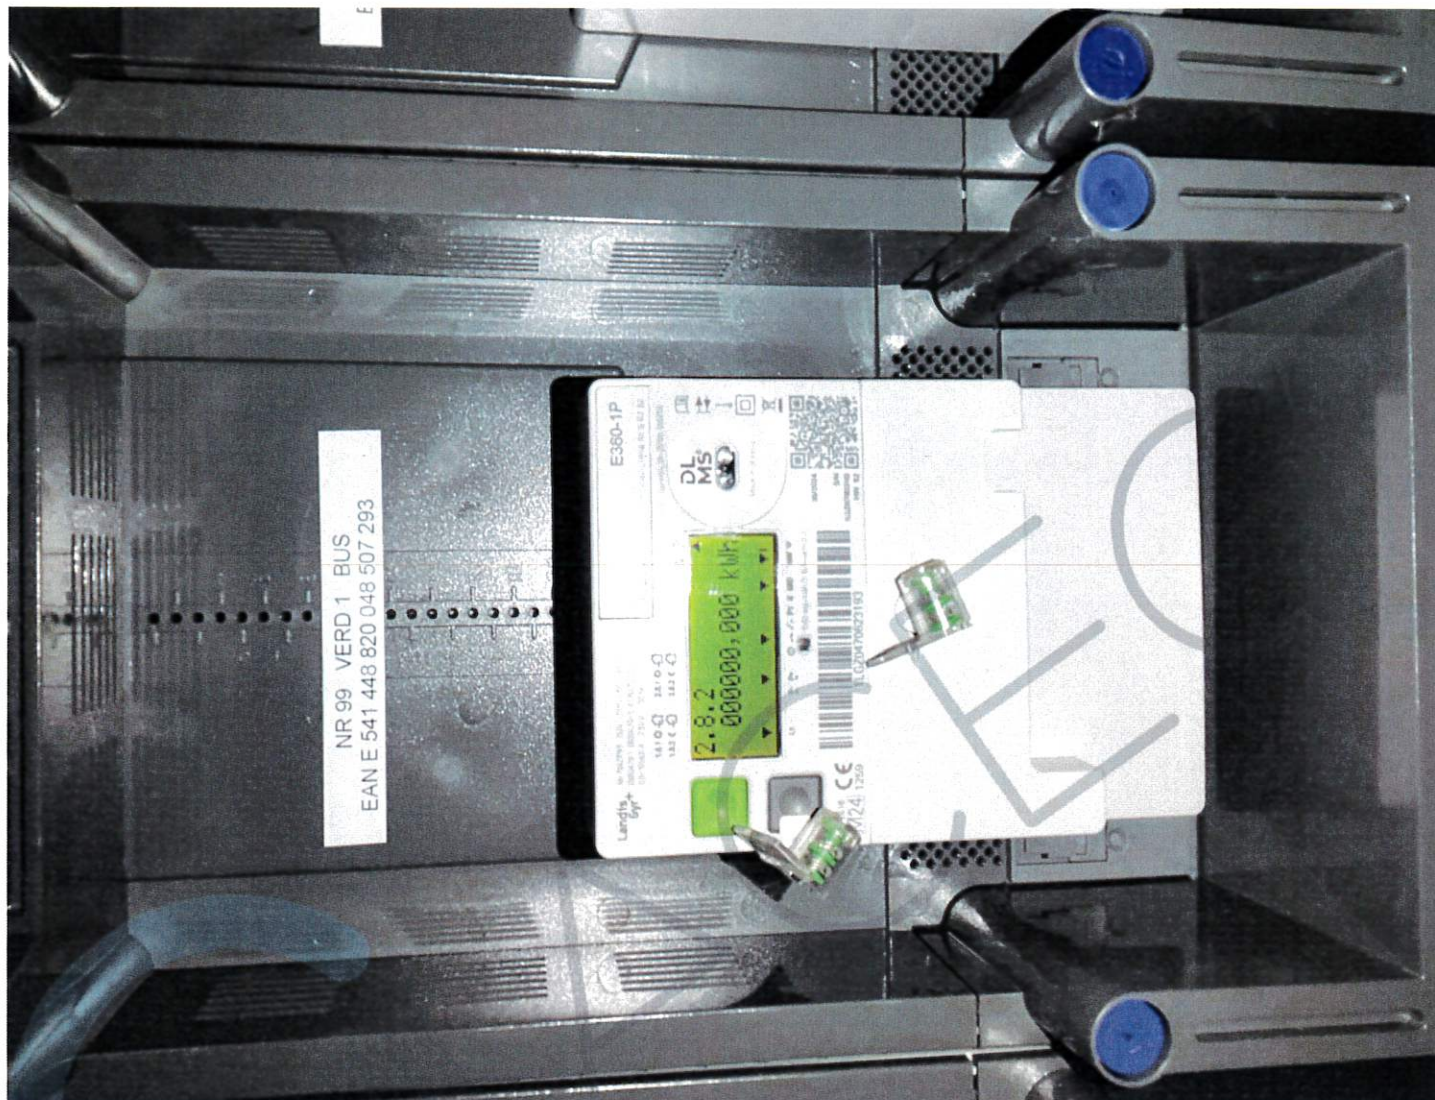



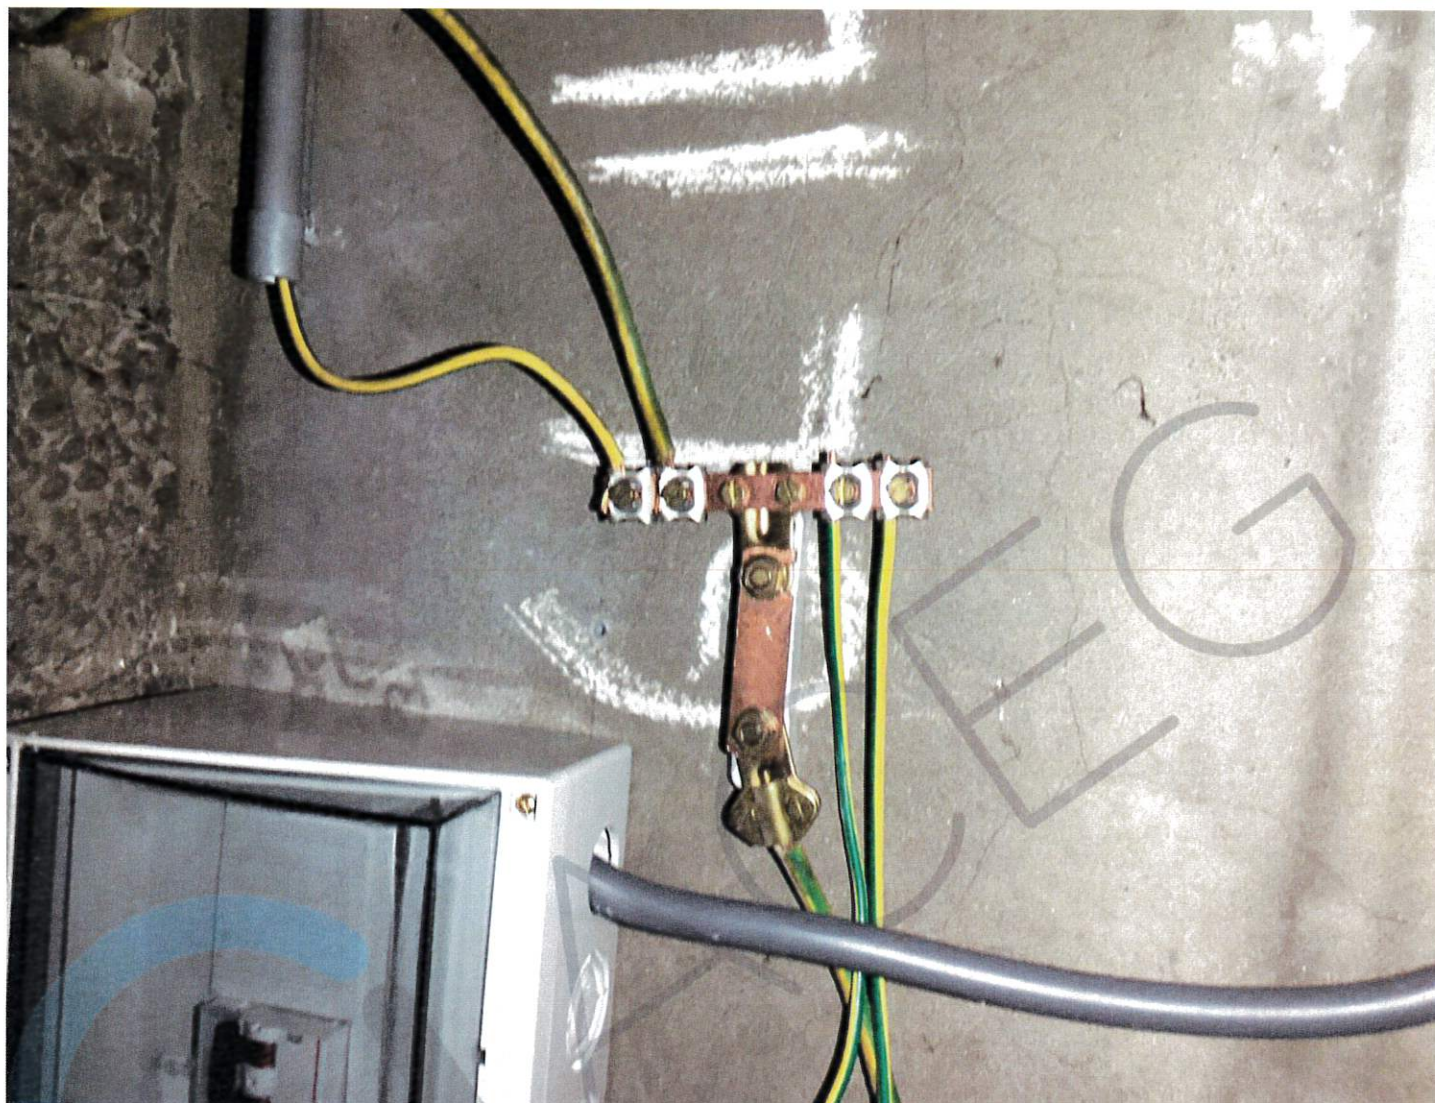

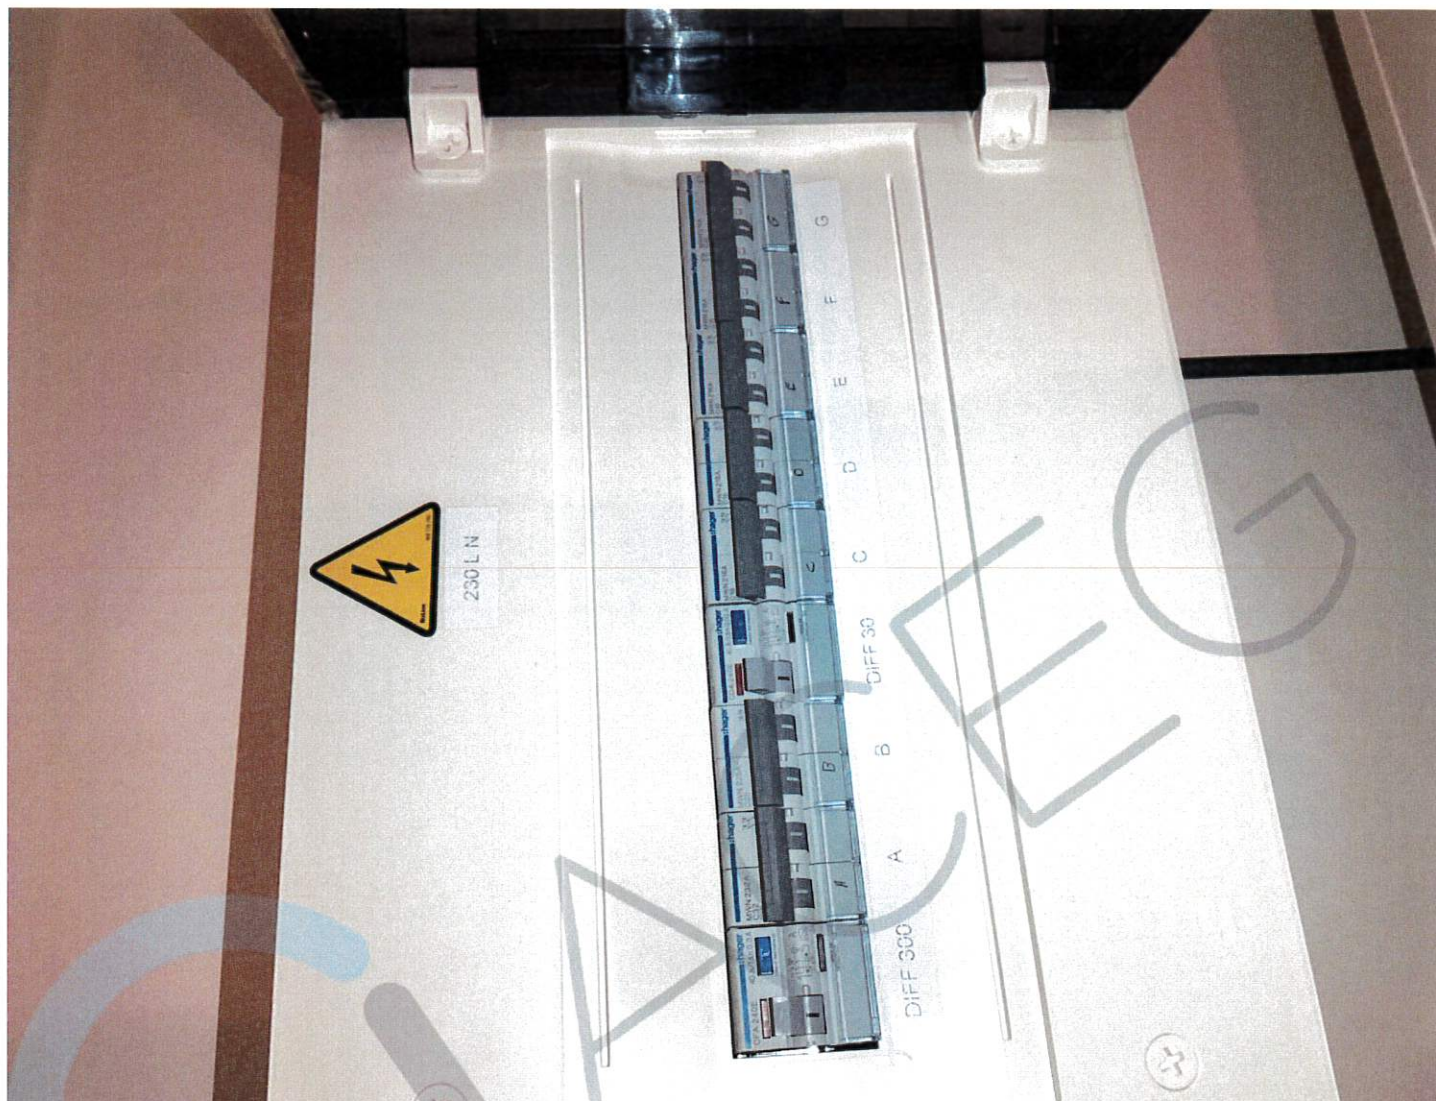

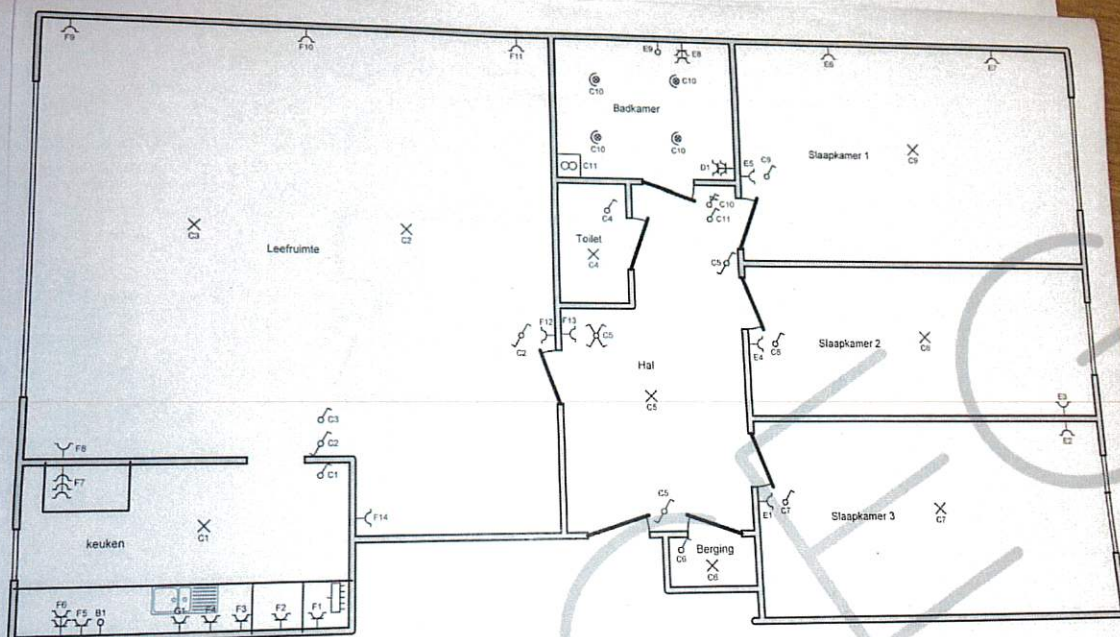


GLACFC
Yoshi van den Lynden
22/11/24

Plaats van de elektrische installatie
Berkenlaan 99 Bus 1e V Links
2940 Hoevenan
EAN E 541 448 820 048 507 293

Installateur
Elk Elektrischewerken bv
Grote Molensweg 199
2940 Slabroek
GSM: 0483 05 88 03
e-mail: jeroen@elk.be
BTW BE 0755.412.442

p. 2/4
Situatieplan
2 x 230V - 50Hz
V 2024-11-21 15:37:08

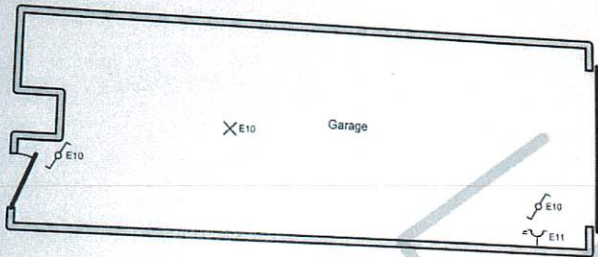


Yusef Van den Eynden
22/11/24


Plaats van de elektrische installatie
Berkenlaan 99 Bus 1e V Links
2940 Hoevenen
EAN E 541 448 820 048 507 293

Installateur
Elk Elektriciteitswerken bv
Grote Molenweg 199
2940 Stabroek
GSM: 0483 05 88 03
e-mail: jeroen@elk.be
BTW BE 0755.412.442



p. 3/4
Situatieplan
2 x 230V ~ 50Hz
V.2024-11-21 15:37:08

- 1
- A
- B Kookplaat
- 2
- C Verlichting
- D Dubbel stopcontact hoek
badkamer
- E Stopcontacten slaapkamers - badkamermuur - garage
- F Stopcontacten
keuken - living - hal
- G Vaatwas


Jeroen van den Eynden

22/11/24

Plaats van de elektrische installatie

Berkenlaan 99 Bus 1e V Links
2940 Hoevenen

EAN E 541 448 820 048 507 293

Installateur

Elik Elektriciteitswerken bv
Grote Molenweg 199
2940 Stabroek
GSM: 0483 05 88 03
e-mail: jeroen@elik.be
BTW BE 0755 412 442

p. 4/4
Lijst Kringen

2 x 230V - 50Hz

V.2024-11-21 15:37:08

