

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 27/10/2025

Inspecteur: Luc De Schutter

Mentor:

Installateur: Elik
Elektriciteitswerken BV

ID-label:

B.T.W. nr.: BE 0755 412 442

Klantreferentie:

Merk en type meettoestel: Metrel
ET61557

Serienummer: 18120206

Datum verslag: 27/10/2025

Plaats van het onderzoek

Straatnaam
Huisnummer
Busnummer
Postcode
Gemeente
Land

Dorpstraat
11

2040
Berendrecht
België

Eigenaar

Naam
Straatnaam
Huisnummer
Busnummer
Postcode
Gemeente
Land

Driessen
Dorpstraat
11

2040
Berendrecht
België

Installateur

Naam
BTW nr.
Telefoonnummer
E-mail

Elik Elektriciteitswerken BV
BE 0755 412 442
0483058803
Jeroen@elik.be

Type : woning

Afbeelding schakel- en verdeelbord:

EAN : 541448820037366849

Teller Nr.: : 4224036



Aard onderzoek:

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 3N400V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 2

Aantal kringen: 29

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders

Ri algemeen: 3,70 MΩ

RE: 25,1 Ω

OK

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	IΔt	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	29	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	27	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
Zie schema's	-	-	-	-	-
Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	OK		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

- N12 De elektrische installatie was niet volledig toegankelijk, wij hadden geen toegang tot volgende lokalen: Bemeubeld en bewoond
- N2 Geen inbreuken vastgesteld.
- N31 Volgens AREI boek 1 8.2.1. is het toegelaten stopcontacten zonder aarding in dienst te laten. Op deze stopcontacten mag men enkel toestellen van de klasse II aansluiten.
- N34 Deze installatie dateert van voor '81, er werd rekening gehouden met de afwijkende beschikkingen vermeld in Boek 1 Afdeling 8.2.1.
- N39 Delen van deze installatie dateren van na 1981, hierdoor zijn de uitzonderingen opgenomen in AREI boek 1 afdeling 8.2.2. ook van toepassing.
- Zonnepanelen zijn niet mee opgenomen in deze keuring.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 27/10/2050
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema('s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 12:12 tot 12:51

De inspecteur Luc De Schutter

Luc De Schutter
ACEG VZW - #263

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.
Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechte strek of onrecht strek, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit
De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 27/10/2050	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.





A B C D E F G H I




J K L M N P Q R S





T U V O1 O2






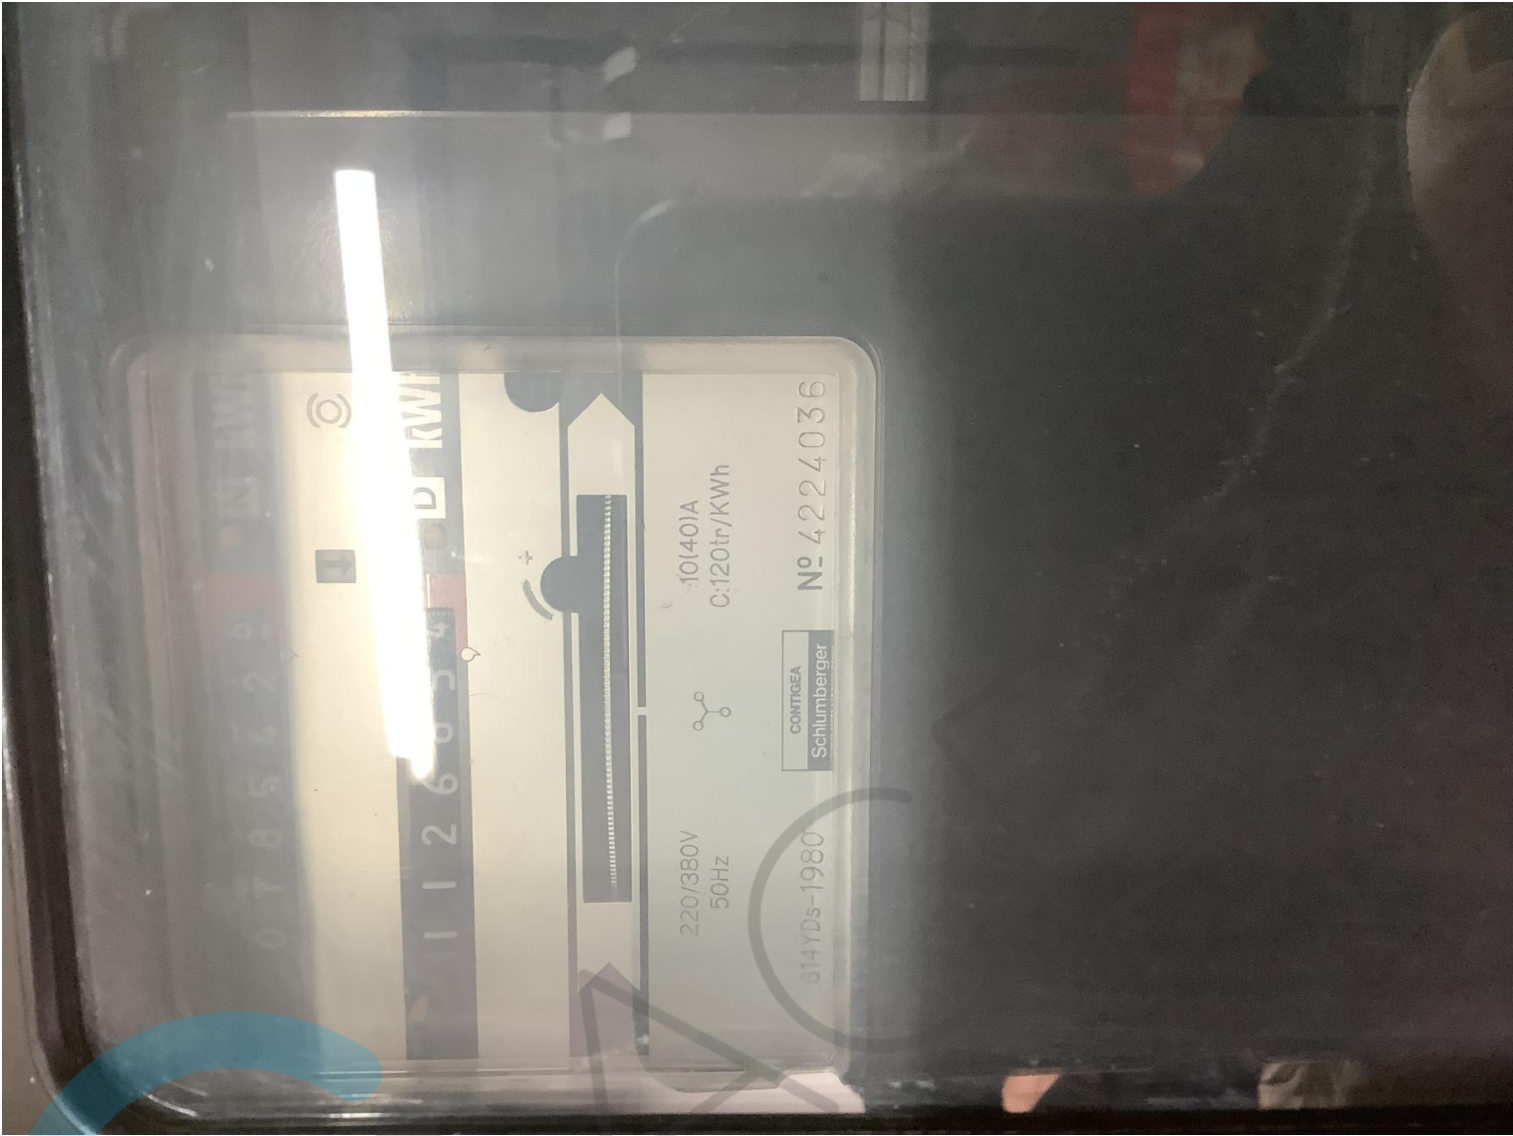

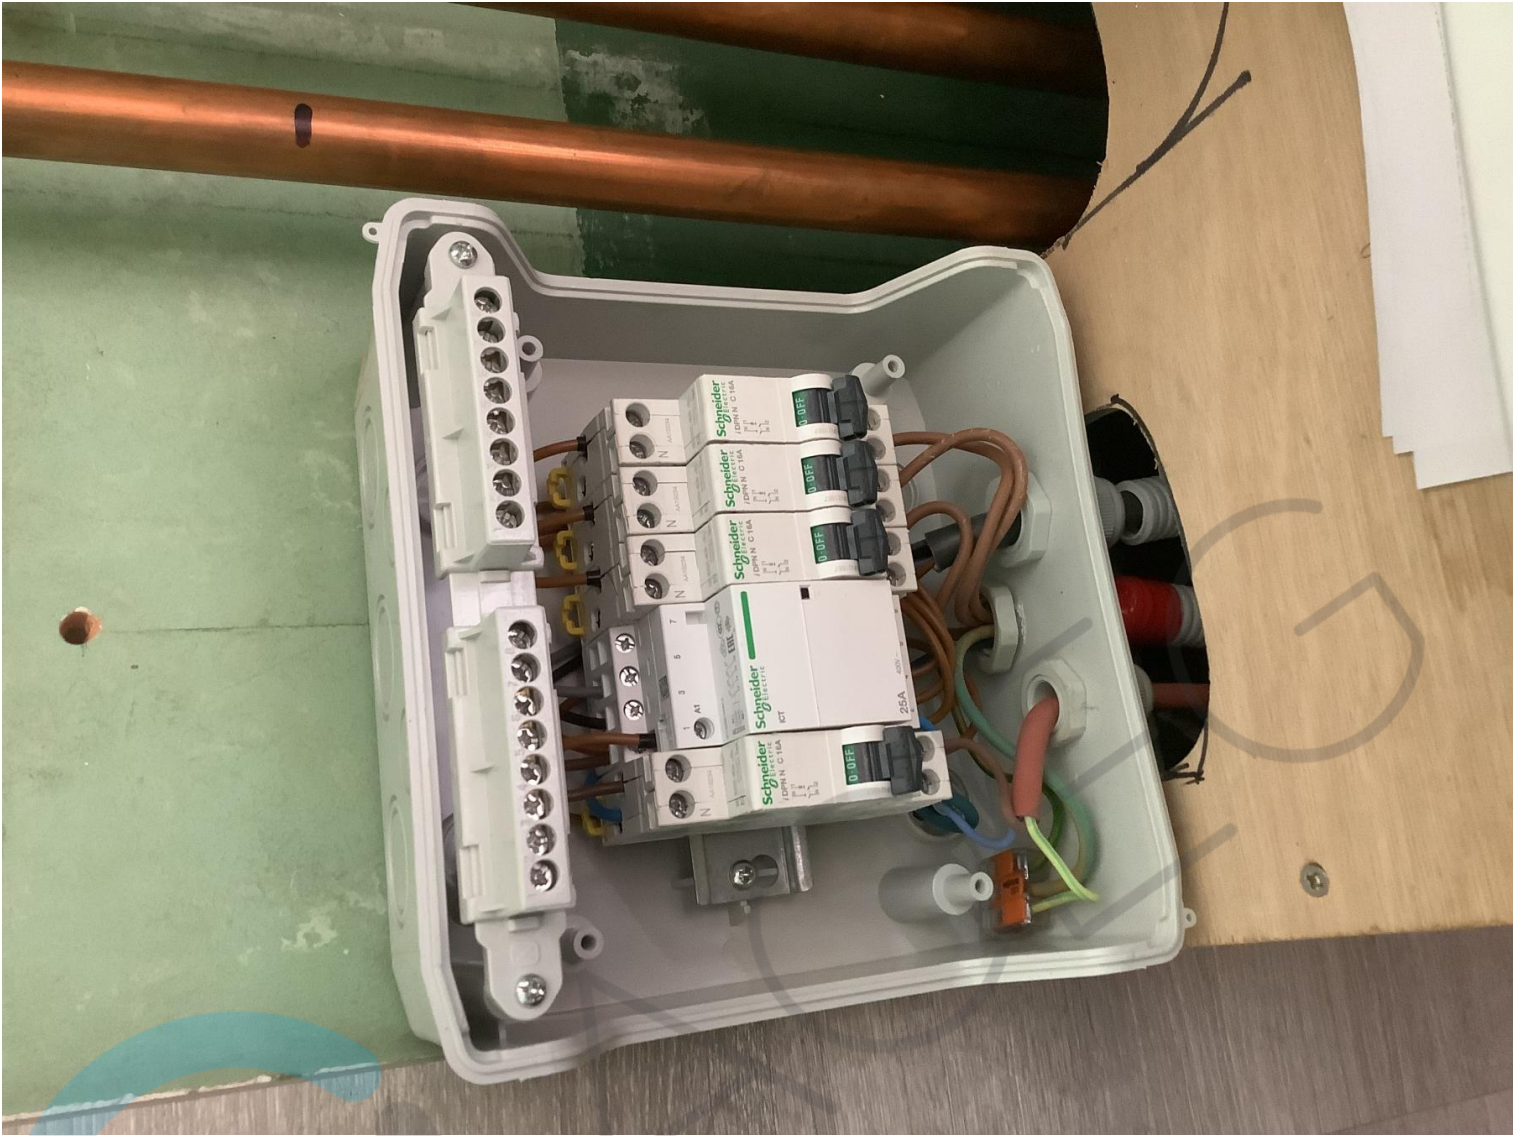

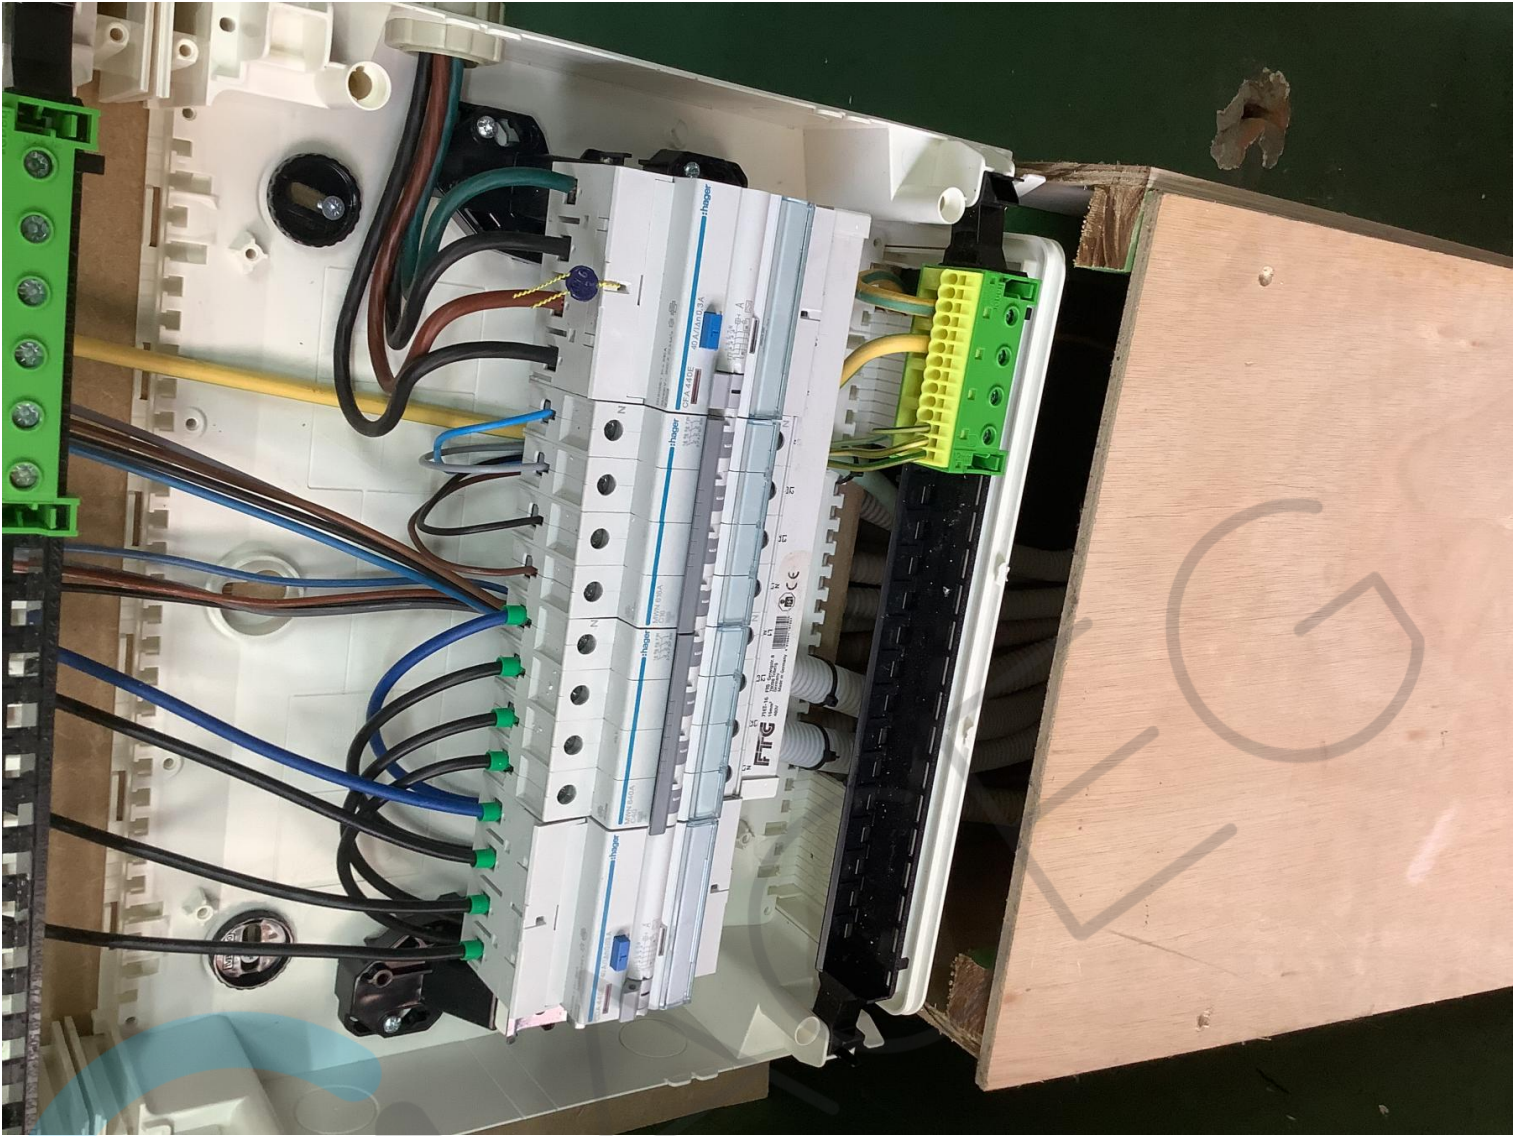




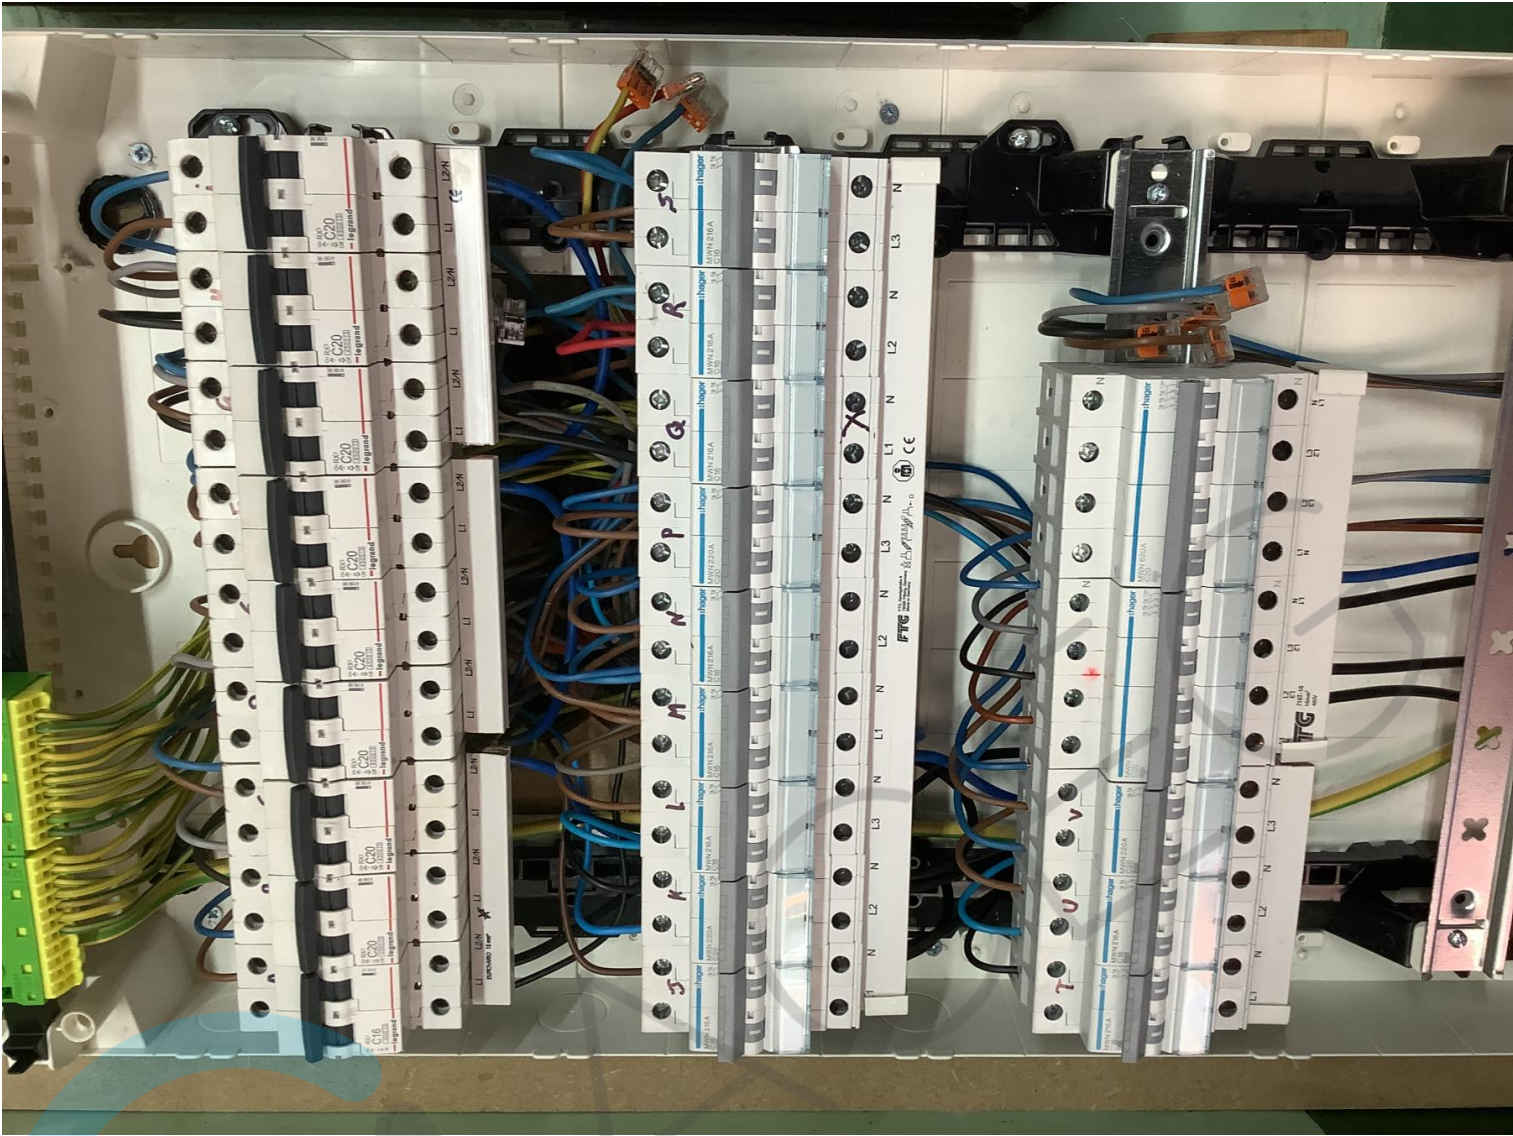





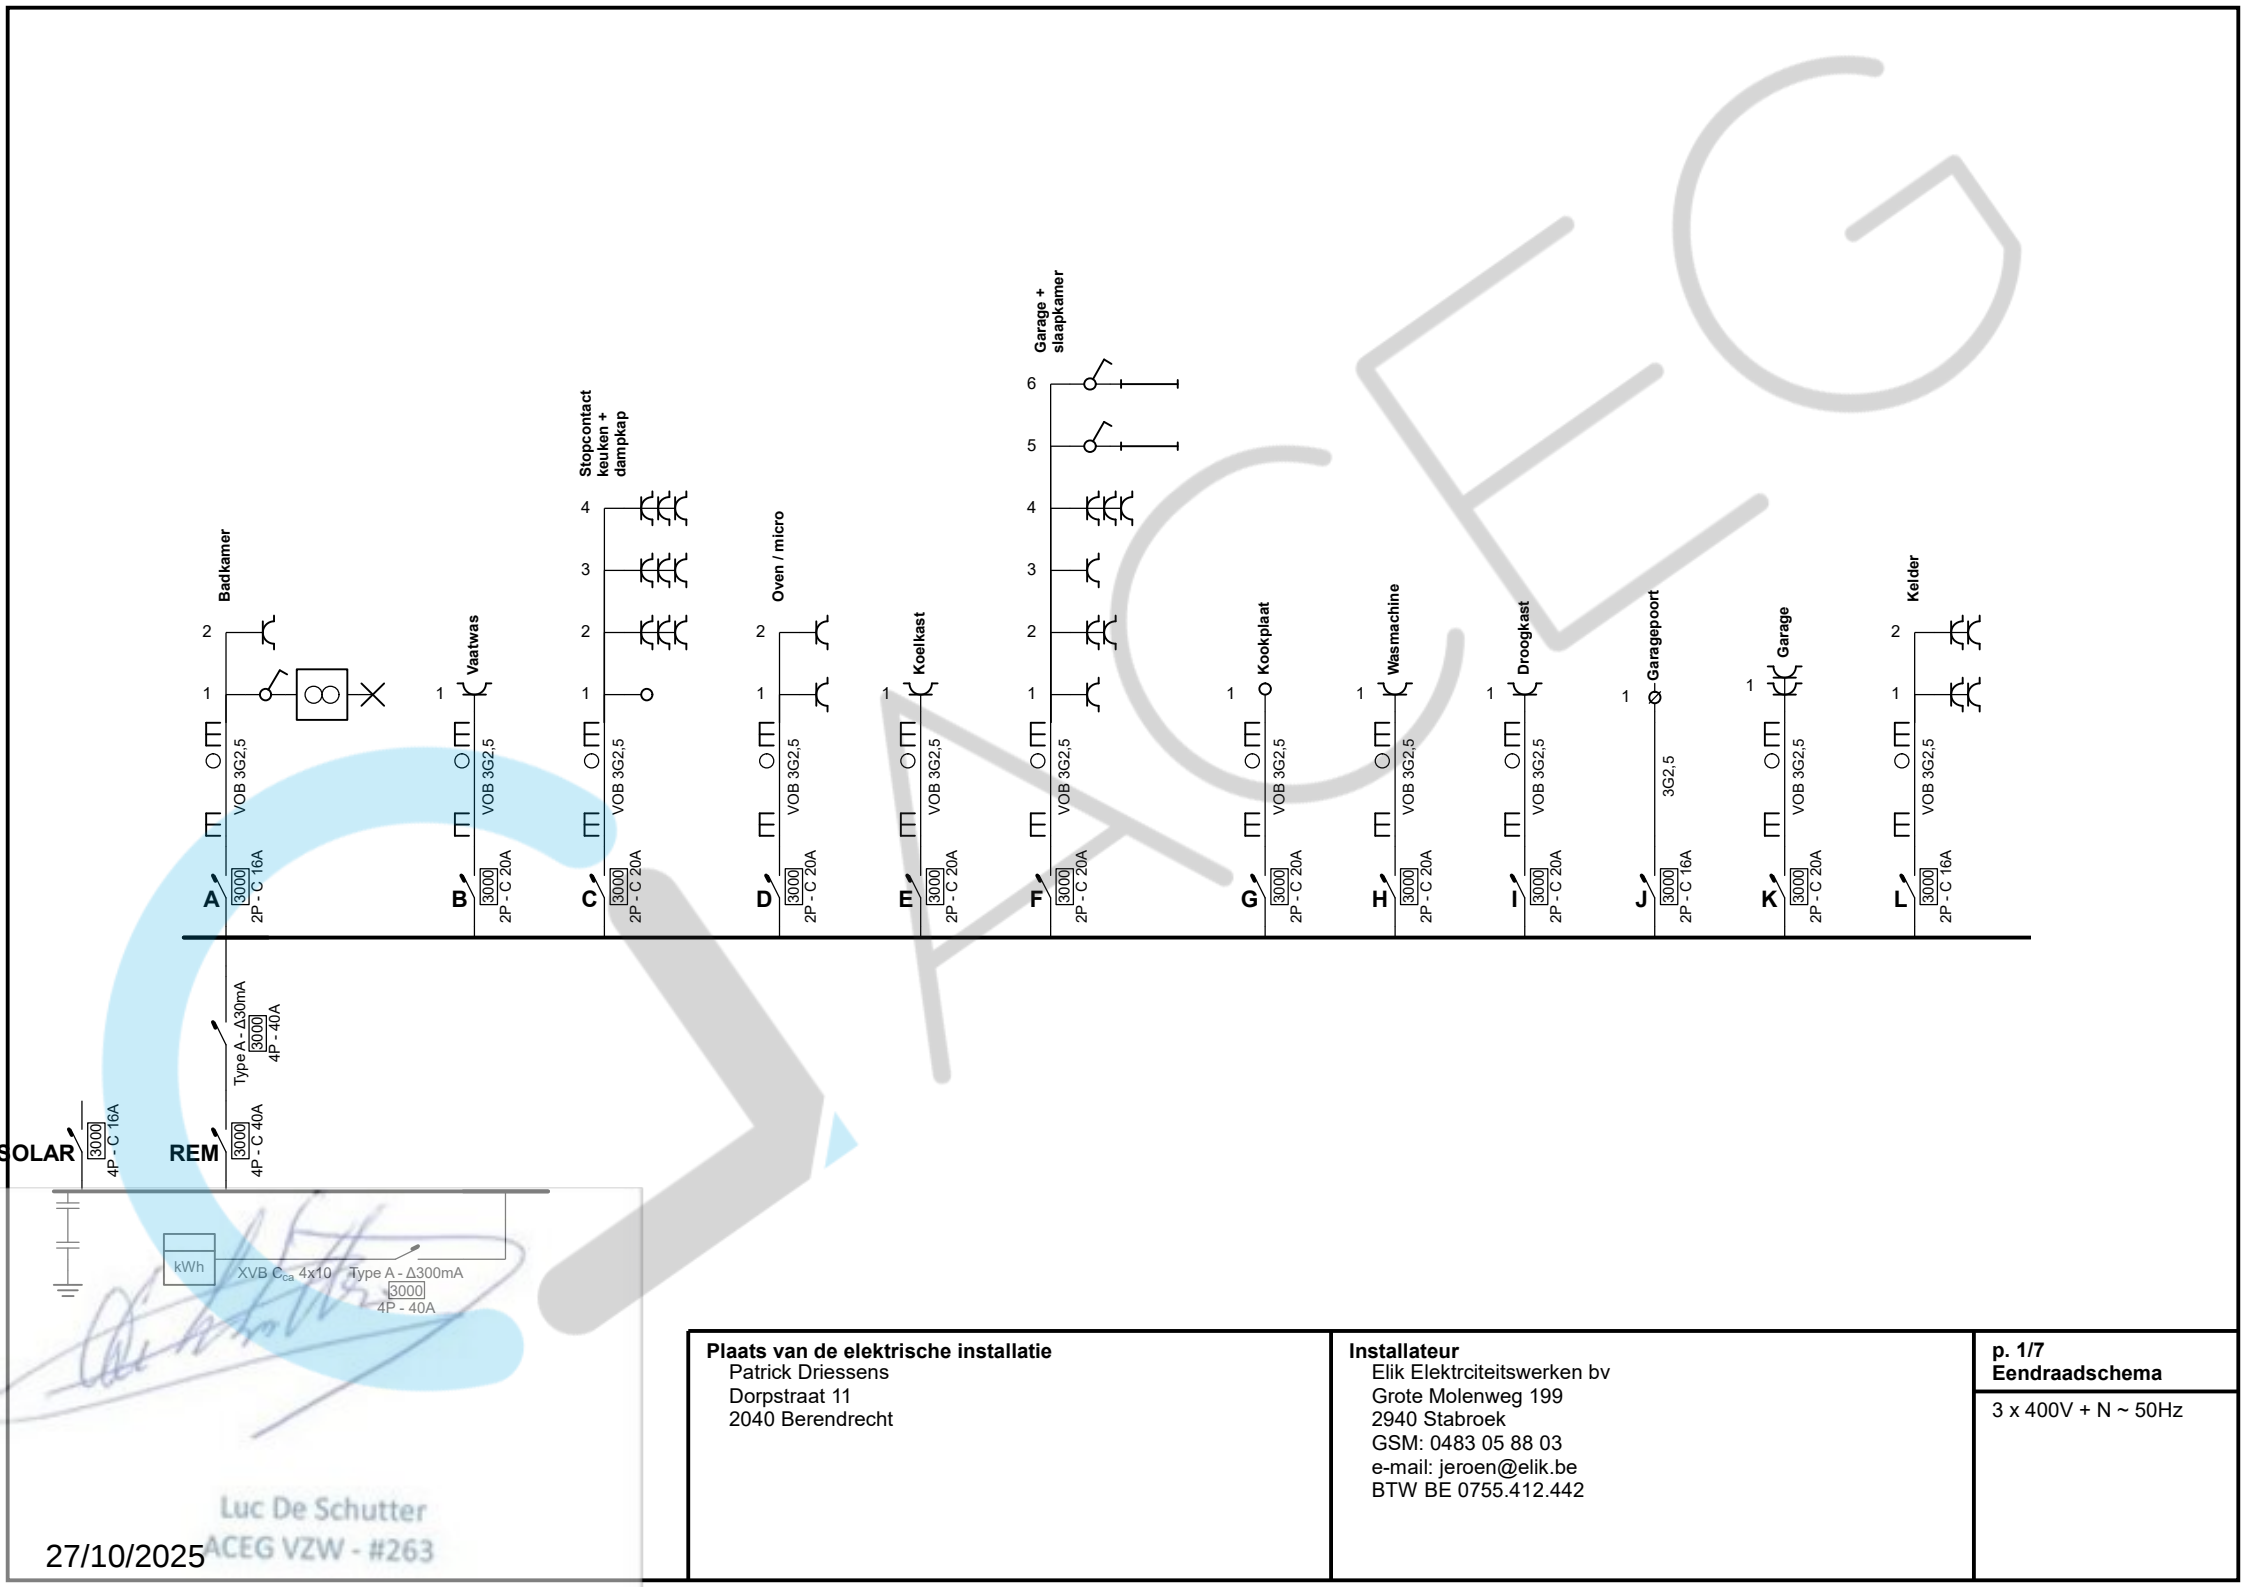

SOLAR


REM

27/10/2025

Luc De Schutter


ACEG VZW - #263

Plaats van de elektrische installatie Patrick Driessens Dorpstraat 11 2040 Berendrecht	Installateur Elik Elektriciteitswerken bv Grote Molenweg 199 2940 Stabroek GSM: 0483 05 88 03 e-mail: jeroen@elik.be BTW BE 0755.412.442	p. 1/7 Eendraadschema
		3 x 400V + N ~ 50Hz

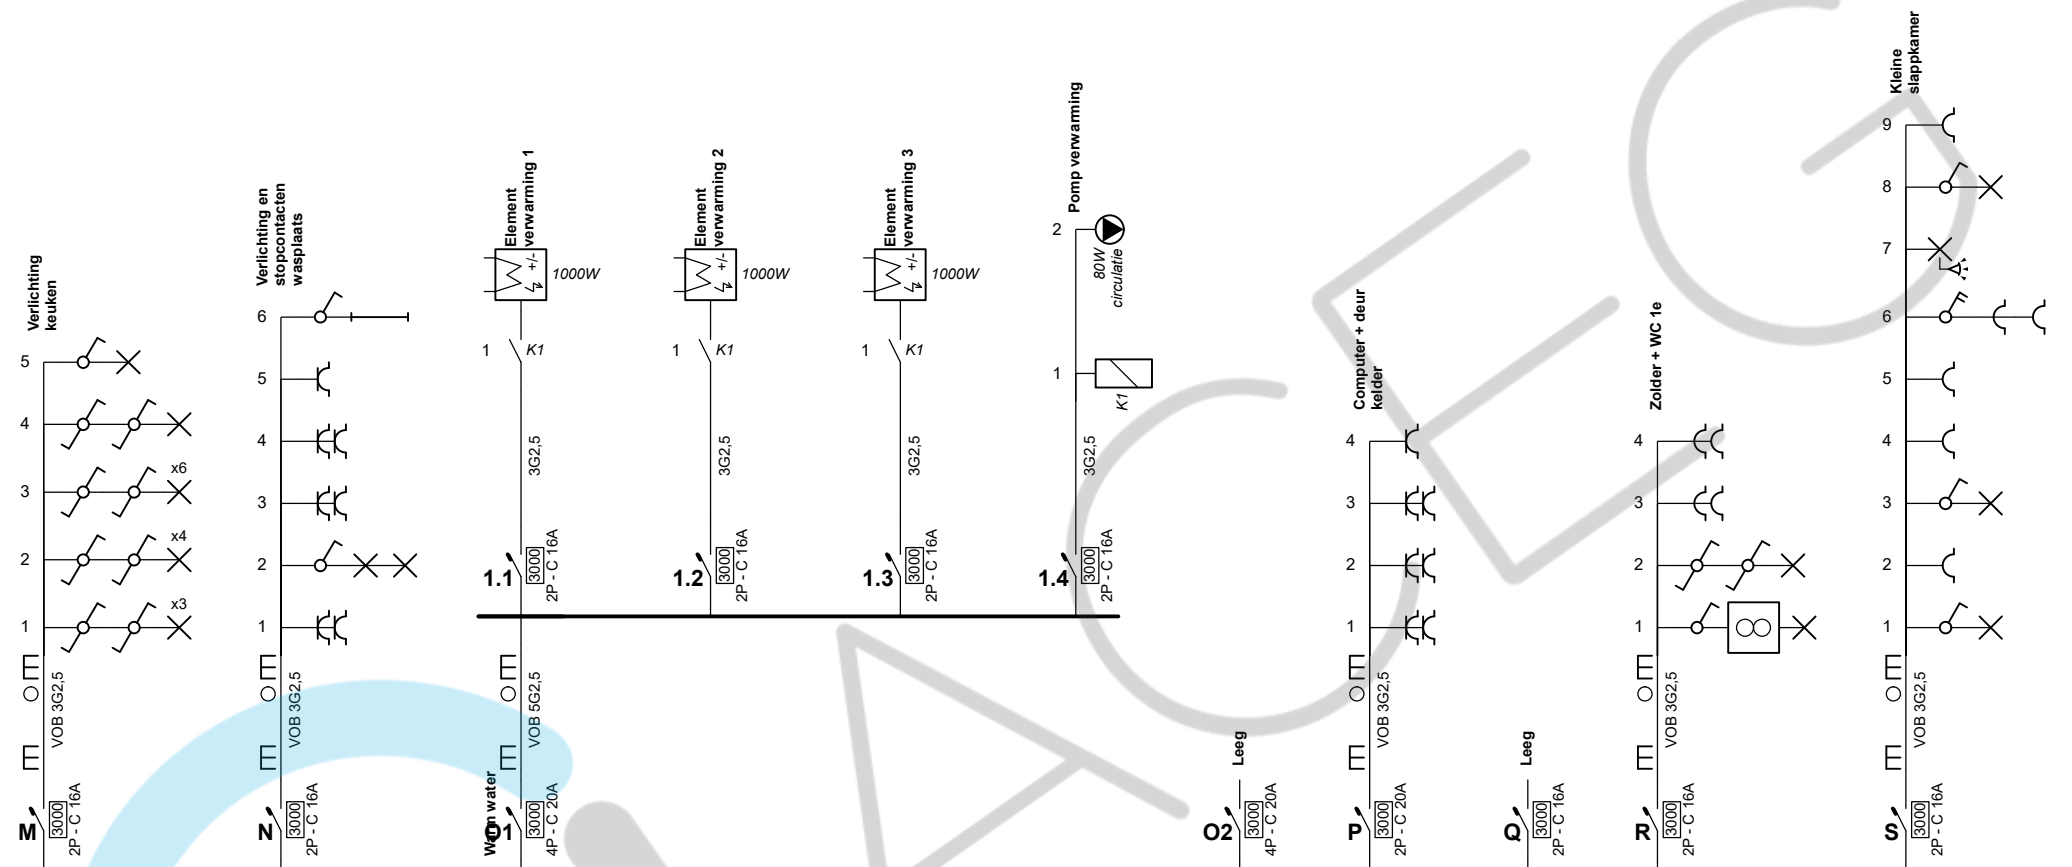


Luc De Schutter
 27/10/2025
 ACEG VZW - #263

Plaats van de elektrische installatie Patrick Driessens Dorpstraat 11 2040 Berendrecht	Installateur Elik Elektriciteitswerken bv Grote Molenweg 199 2940 Stabroek GSM: 0483 05 88 03 e-mail: jeroen@elik.be BTW BE 0755.412.442	p. 2/7 Eendraadschema 3 x 400V + N ~ 50Hz
--	---	---

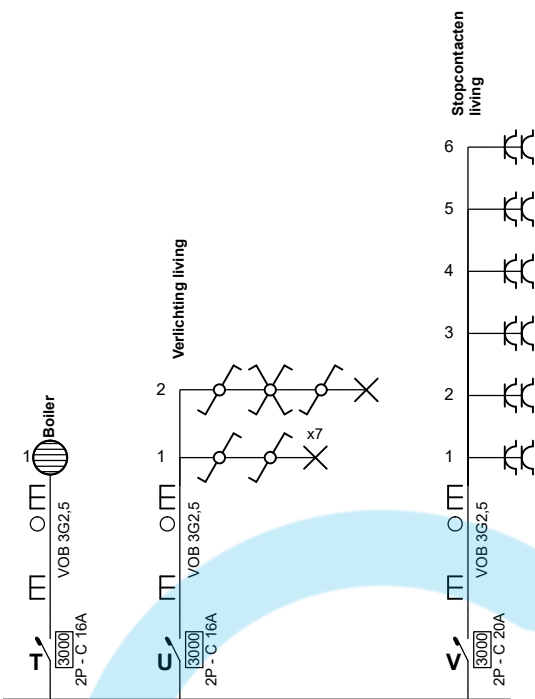




 Luc De Schutter
 ACEG VZW - #263
 27/10/2025

Plaats van de elektrische installatie Patrick Driessens Dorpstraat 11 2040 Berendrecht	Installateur Elik Elektriciteitswerken bv Grote Molenweg 199 2940 Stabroek GSM: 0483 05 88 03 e-mail: jeroen@elik.be BTW BE 0755.412.442	p. 3/7 Eendraadschema 3 x 400V + N ~ 50Hz
--	---	---

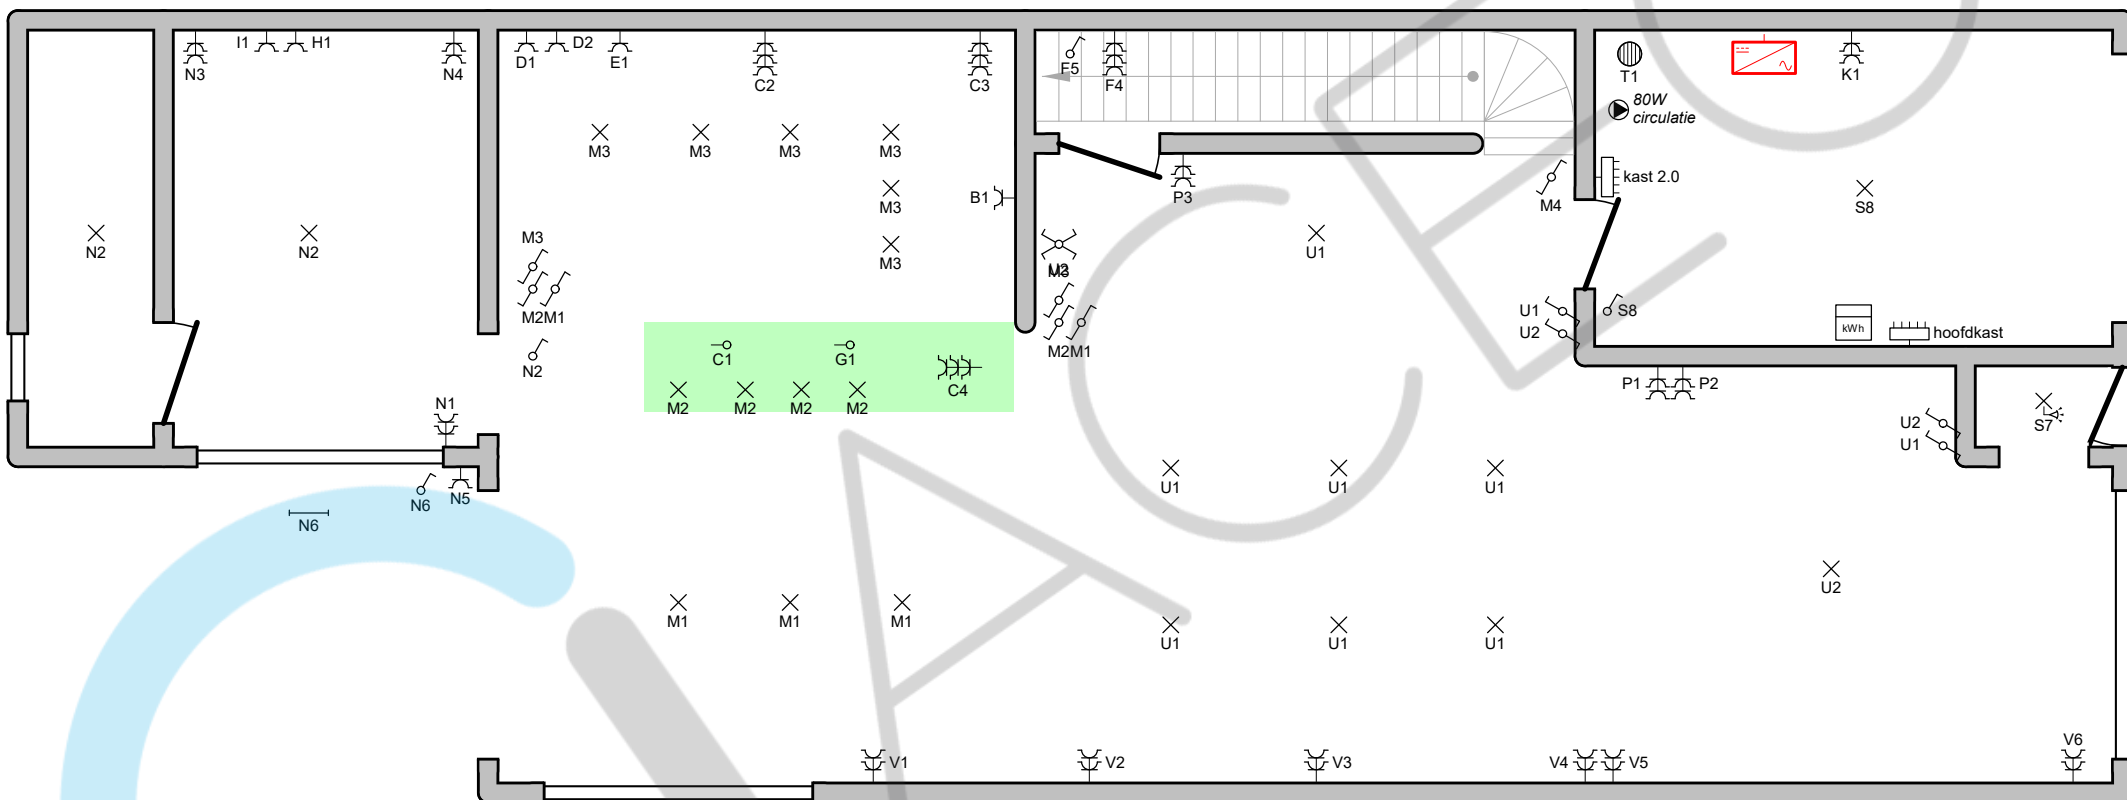

Luc De Schutter
 27/10/2025 ACEG VZW - #263

Plaats van de elektrische installatie Patrick Driessens Dorpstraat 11 2040 Berendrecht	Installateur Elik Elektriciteitswerken bv Grote Molenweg 199 2940 Stabroek GSM: 0483 05 88 03 e-mail: jeroen@elik.be BTW BE 0755.412.442	p. 4/7 Situatieplan 3 x 400V + N ~ 50Hz
--	---	---

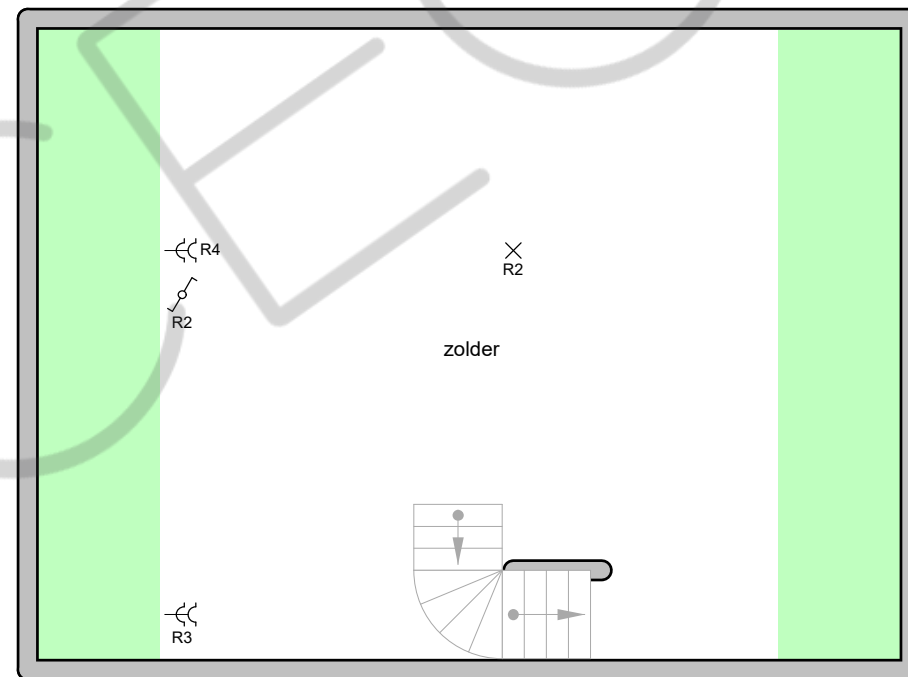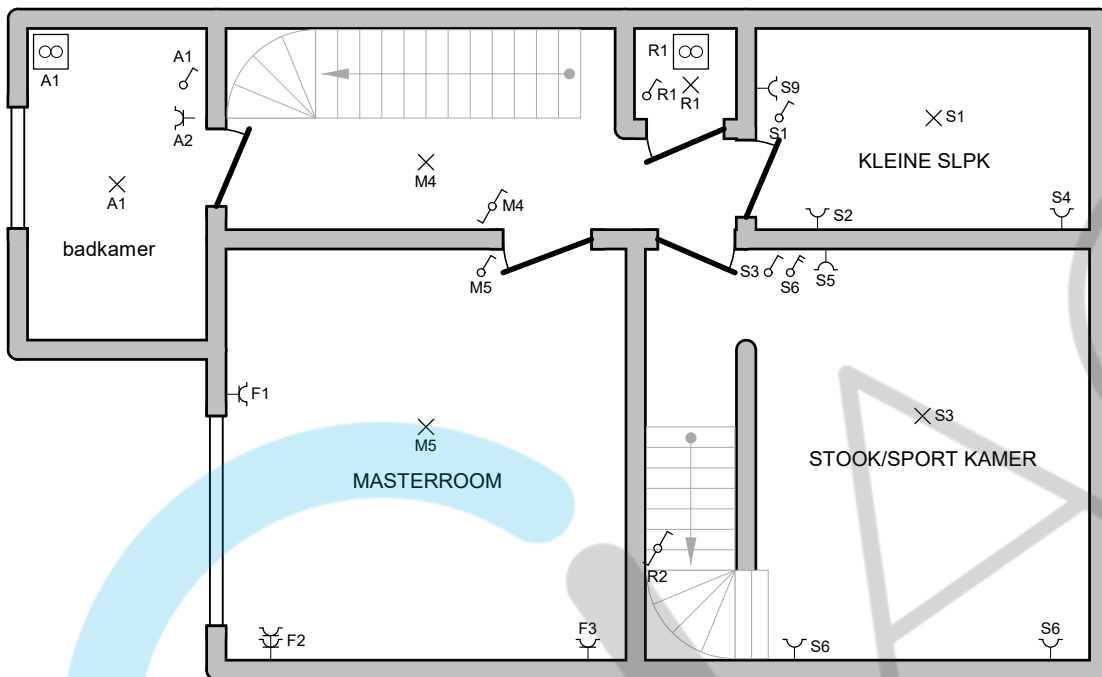

Luc De Schutter

Luc De Schutter
ACEG VZW - #263
27/10/2025

Plaats van de elektrische installatie


Patrick Driessens
Dorpstraat 11
2040 Berendrecht

Installateur

Elik Elektriciteitswerken bv
Grote Molenweg 199
2940 Stabroek
GSM: 0483 05 88 03
e-mail: jeroen@elik.be
BTW BE 0755.412.442

**p. 5/7
Situatieplan**

3 x 400V + N ~ 50Hz

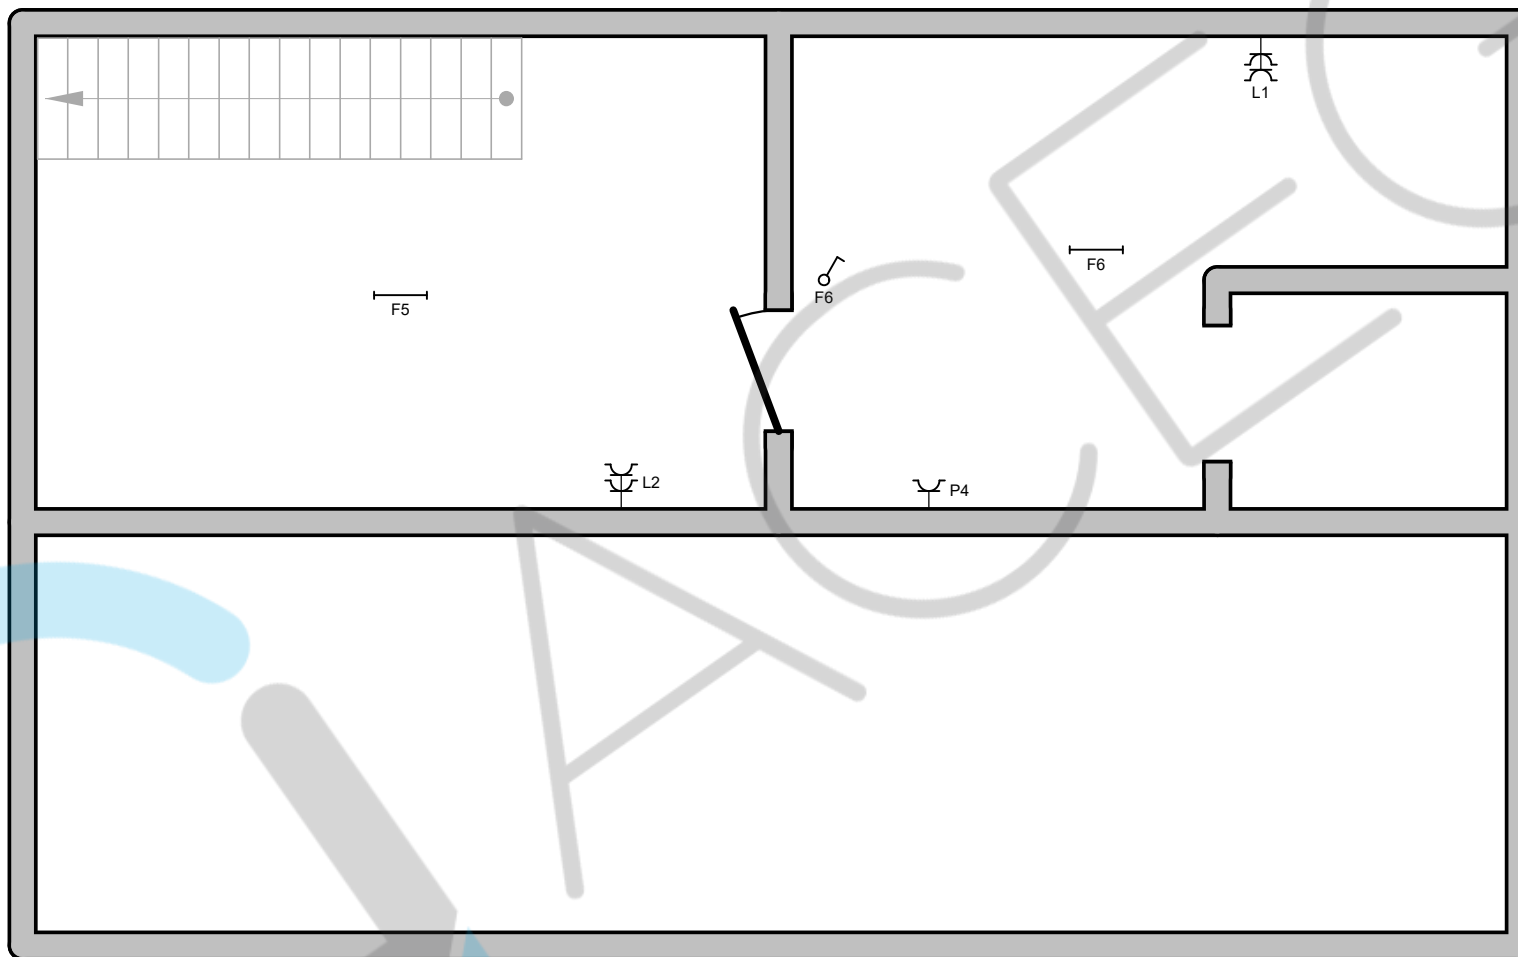


Luc De Schutter
27/10/2025
ACEG VZW - #263

Plaats van de elektrische installatie Patrick Driessens Dorpstraat 11 2040 Berendrecht	Installateur Elik Elektriciteitswerken bv Grote Molenweg 199 2940 Stabroek GSM: 0483 05 88 03 e-mail: jeroen@elik.be BTW BE 0755.412.442	p. 6/7 Situatieplan
		3 x 400V + N ~ 50Hz

SOLAR	
REM	
A	Badkamer
B	Vaatwas
C	Stopcontact keuken + dampkap
D	Oven / micro
E	Koelkast
F	Garage + slaapkamer
G	Kookplaat
H	Wasmachine
I	Droogkast
J	Garagepoort
K	Garage
L	Kelder
M	Verlichting keuken
N	Verlichting en stopcontacten wasplaats
O1	Warm water
1.1	Element verwarming 1
1.2	Element verwarming 2
1.3	Element verwarming 3
1.4	Pomp verwarming
O2	Leeg

P	Computer + deur kelder
Q	Leeg
R	Zolder + WC 1e
S	Kleine slappkamer
T	Boiler
U	Verlichting living
V	Stopcontacten living
hoofdkast	
kast 2.0	

Plaats van de elektrische installatie

Patrick Driessens
Dorpstraat 11
2040 Berendrecht

Installateur

Elik Elektriciteitswerken bv
Grote Molenweg 199
2940 Stabroek
GSM: 0483 05 88 03
e-mail: jeroen@elik.be
BTW BE 0755.412.442

p. 7/7
Lijst Kringen

3 x 400V + N ~ 50Hz

27/10/2025

Luc De Schutter
ACEG VZW - #263
