



APRAGAZ

V.Z.W.
Uw Controle Organisme

VERSLAG № ...2074666 12048nl

Afgevaardigde: Gielis

Vilvoordse steenweg, 166 B-1120 Brussel Tel. 32/2/264.03.60 - Fax. 32/2/268.89.58 email: info@APRAGAZ.com

KR buba Shaluthoustersteeweg 93 2950 Ghapellen APRAGAZ	referenties KR buba 17568/P001	Gegevens installateur (Naam, Voornaam, BTW nr.) KR buba Shaluthoustersteeweg 93 2950 Ghapellen
Verslag aangaande: ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE - HUISHOUELIJK Uitgevoerd te: Stalbroek Op: 7/6/2018		

P E 207 rev 2

Identificatie van de installatie

Klant: KR buba	Tel nr.:
Adres: Shaluthoustersteeweg 93	
2950 Stalbroek	
Type installatie: Nieuwe ☒ Bestaande ☐ Uitbreiding ☐ Modificatie ☐ Tijdelijke ☐	

Type bezoek

Gelijkvormigheidsonderzoek (art 270) ☒ Controlebezoek (art. 271) ☐ Verzwaring (art 276) ☐ Verkoop (art 276bis) ☐

Gegevens van de installatie

Type installatie: Woonruimte ☒ Huishoudelijke werkeenheden ☐ Gem. Delen v/e residentieel geheel ☐	
Residentieel geheel ☐ Beschrijf: 2 verdiepingen	
Elektriciteitsleverancier: Eandis	EAN code: 541448860017960605
Teller: Merk & type: ITRON	serie n°: 3862841
Spanning (V): 1 x 230 V + N	Max stroom (A): 40
Type elektrode: Lus ☐ pen(nen) ☒ andere ☐	Spreadingsweerstand Ra: 17,29 ohm P E 003

Beschrijving installatie (Overstroom)

Beschrijving installatie: zie schema ☒ zie opstellingsschema ☒ zie lijst beschrijving ☐	OK ☒ NOK ☐
Inplanting verdeelborden gemakkelijk bereikbaar (art 248)	OK ☒ NOK ☐
Zwembad (art 90) aanwezig ☐ niet aanwezig ☒	Sauna (art 91) aanwezig ☐ niet aanwezig ☒
Voedingskabel hoofdbord: Type: E.V.R. sectie L: 10 mm ² + N: 10 mm ² + PE: 16 mm ²	
Hoofdbeveiliging: merk & type: Vynckin EP102 G1	
Overstroom: 10 A Kortsluitstroom: 200 A Onderbrekingsvermogen: 10 kA	
Hoofdschakelaar: aantal polen: 2 lth: nominale thermische stroom: 10 A	

Beveiliging				Merk en type beveiliging	Sectie (mm ²)	Beschrijving
aantal	N°	# polen	I(A)			
1		2	40	Vynckin EP102 G1	10	hoofd automaat
1	T1	2	40/10,3	Vynckin D01 22,5kA	10	hoofd diff
1	A	2	25	Vynckin EP32 30003	4	stopcontact
1	G	2	25	Vynckin EP32 30003	2,5	stopcontact
4	CDEF	2	20	Vynckin EP32 30003	2,5	Verlichting
1	B	2	16	Vynckin EP32 30003	2,5	stopcontact
1	H	2	6	Vynckin EP32 30003	2,5	stopcontact
1	I	2	40/10,3	Vynckin D01 22,5kA	10	diff. bescherming
4	M M2 P	2	10	Vynckin EP32 30003	2,5	stopcontact
3	K L N	2	16	Vynckin EP32 30003	2,5	Verlichting / stopcontact
1	O	2	6	Vynckin EP32 30003	2,5	stopcontact

Spanning: **230** V Frequentie: 50Hz ☒ /DC ☐ - Onderbrekingsvermogen 3000 ☒ 1500 ☐ andere ☐kA

Aantal verdeelborden: **1** aantal kringen: **12**

Zijn beveiligingen in overeenstemming met de ϕ geleiders, toestellen en materieel

OK ☒ NOK ☐

Beschermingsgeleider sectie voldoende

OK ☒ NOK ☐

Schakelkasten	Gesloten ☒ Metalen (kl 1) ☐ Kunststof (kl 2) ☒ Open ☐ Achterwand niet wateropslopend ☐
Leidings	Draad ☒ Kabel ☒ In buis ☒ Opbouw ☐ Verzonken ☒ Ondergronds ☐ Buiten ☐ Andere ☐
Apparaten	Verlichting ☒ stopcontacten ☒ met aarding ☒ zonder aarding ☐ Vaste toestellen ☐
Aanraking onmogelijk door:	Isolatie ☒ Omhulsel ☒ Staat vast materiaal OK ☒ NOK ☐
Bescherming tegen direct contact:	voldoende ☒ onvoldoende ☐

Differentieel schakelaar ≤ 300mA aanwezig ☒		Vochtige ruimtes ≤ 30 mA aanwezig ☒	
In (A)	Icc (A)	d In (A)	beschermde circuits
10	3000	0,3	hoofdschakelaar
10	3000	0,03	diff. voedingen
PE verbindingen continuïteit OK ☒ NOK ☐		Testknop OK ☐ NOK ☐ Injectie foutstroom OK ☐ NOK ☐	
Bescherming tegen indirect contact:		voldoende ☒ onvoldoende ☐	

Apparaat: Norma UNILAP 100 ☐ Kyoritsu 3243 ☐ metrel 61557 ☒ andere ☐

Losgekoppelde verbindingen:

Isolati weerstand: Ri... 9,411 Mohm (Testspanning 500V) RI : OK ☒ NOK ☐

Kringen metingen niet uitgevoerd:


Kringen meting te zwak door aard kring

Inbreuken

Nota:

De installatie is ~~is niet~~- conform, uitgezonderd de hierboven vermelde opmerkingen.
Het eendraad schema en het situatieschema zijn geïviseerd. ☒ n° van de schema's:
Differentieelschakelaar verlood. ☐
De installatie moet nagezien worden voor ... 7/6/2013 (art. 271 AREI) - door onze diensten -
alsook alvorens indienststelling na modificatie of belangrijke uitbreiding, uitgevoerd vóór deze datum.
De installatie mag - mag niet - in dienst - genomen - gehouden - worden voor zover zonder uitstel de inbreuken
verholpen worden en voor zover de nodige voorzorgen genomen zijn zodat deze installatie geen gevaar vormt voor
personen en goederen.
Het is een verplichting van dit proces-verbaal te bewaren in het elektrische dossier. Voorgaande aanwezig ☐ niet aanwezig ☒
Het is een verplichting van in het dossier elke wijziging aan de elektrische installatie te melden.
Het is een verplichting van elk ongeluk aan personen dat rechtstreeks of onrechtstreeks een gevolg is van elektriciteit onmiddellijk te melden aan
de Minister van Economische zaken, Directie Elektrische Energie.
Enkel zichtbare en bereikbare delen werden nagezien
Dit rapport bestaat uit ... 1 ... pagina's




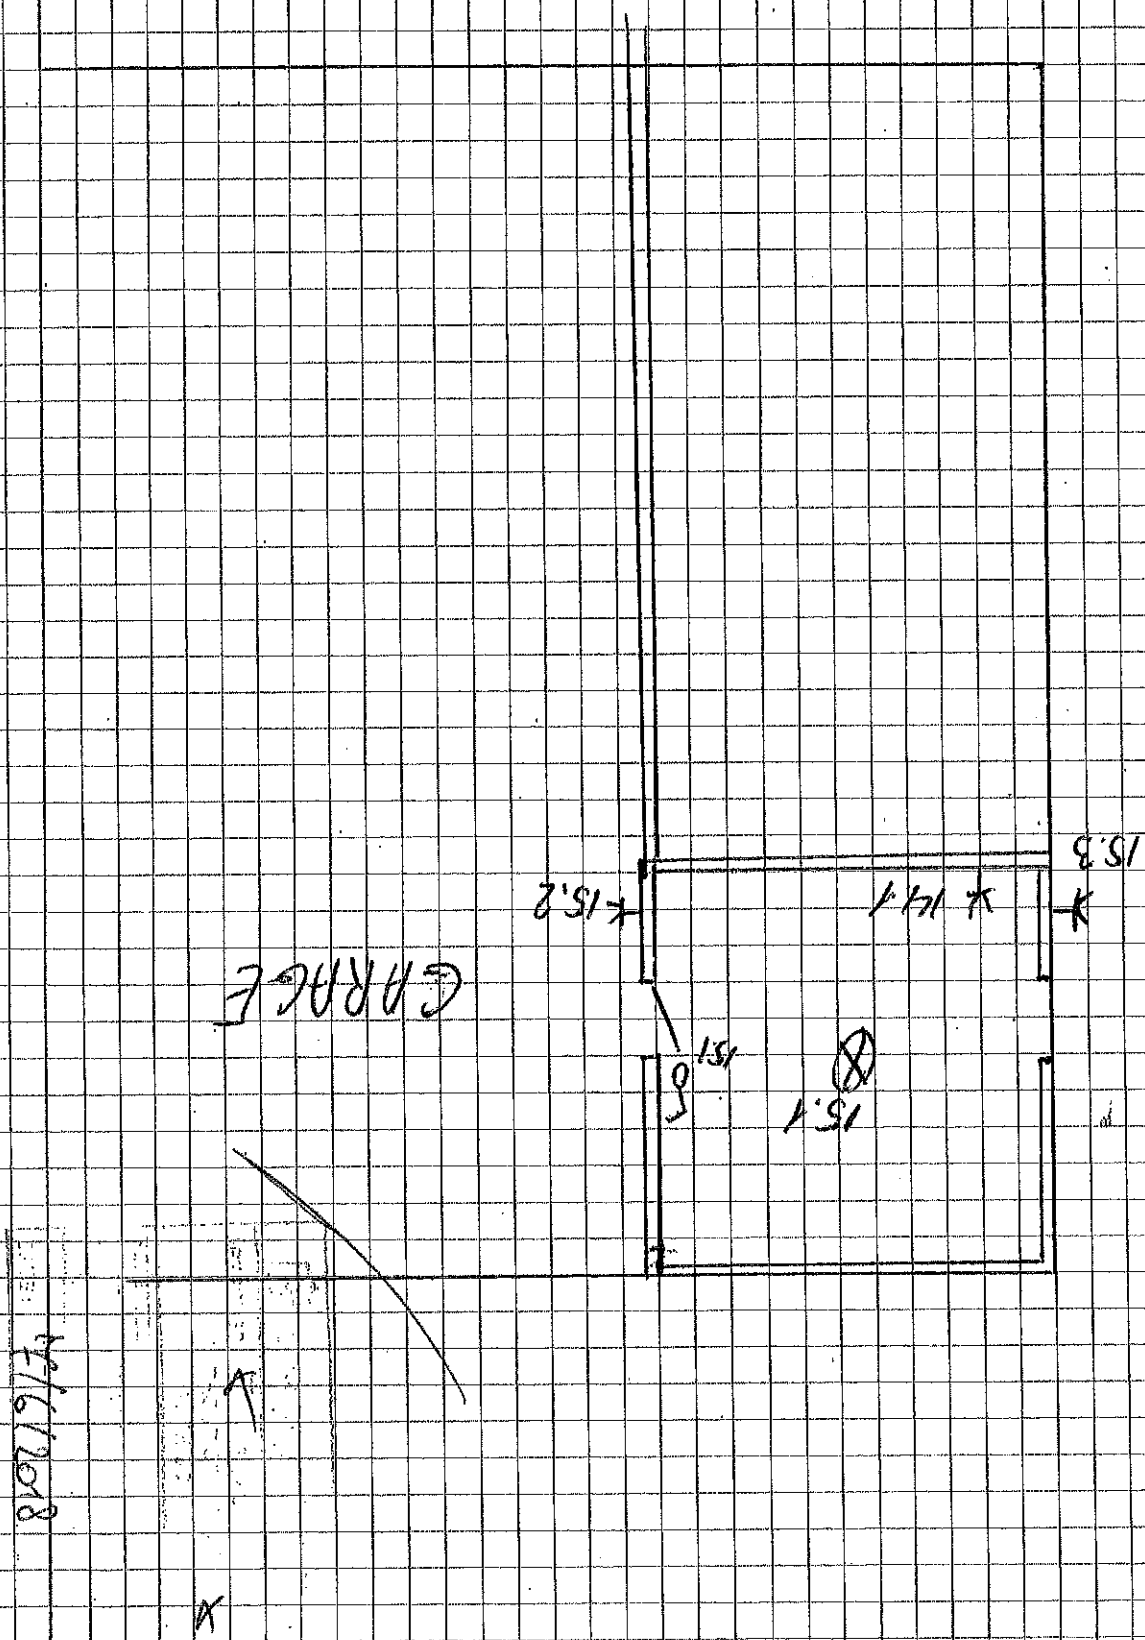

GARAGE

2764/18

[B] APRAGAZ
M. Tjampens




5.2

17.1

5.1

5.1

BOILER
ROOM



12.3

230V

10x4

A
40A
300mA

B
16A

C
20A

D
20A

E
20A

F
20A

G
25A

H
6A

I
40A
30mA

J
20A

K
16A

L
16A

M
20A

N
16A

M
20A

O
6A

P
20A

50.1.1	K2.1	K3.1	K4.1	K5.1	K6.1	K7.1
50.2.1.2	K2.2	K3.2	K4.2			
50.3.1.3						
50.4.1.4	K2.3	K3.3	K4.3			
50.5.1.5	K2.4	K3.4				
50.6.1.6	K2.5	K3.5				
50.7.1.7		K3.6				
361.5						
362.5						
362.5						
362.5						
364						
362.5						

K8.1	50.9.1	K10.1	K11.1	K12.1	K13.1	K14.1	50.15.1
K8.2	50.9.2	50.10.2					K15.2
K8.3	K9.3						K15.3
K8.4							

11/6/2018
