

Atlas Controle
Chaussée De La Hulpe 181 box 1
1170 Brussels
Belgium

VERSLAG VAN ONDERZOEK: HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Verslag Nr:

11.388

Datum van bezoek:

10-06-2022

Plaats van het onderzoek:

Velodreef 137 - Essen 2910

Inspecteur:

Okan Atmaca

Aard onderzoek:

Controlebezoek (Livre 1 6.5)

De datum van opstelling:

10-06-2022 11:43:59

Volgend controlebezoek:

10-06-2023

Algemene gegevens

Adres van de installatie

Velodreef 137 - Essen 2910

Gebouw

Huis

Propriétaire, gestionnaire ou exploitant

Eigenaar Velodreef 137 - 2910 Essen

Adres van de eigenaar

Velodreef 137 - Essen 2910

Installateur

Gegevens verdeler

DNB

Fluvius

Nummer teller

33931229

EAN code

Meter/bord verbinding

XVB 4X10

Net spanning

3 x 400 V + N

Maximum beveiliging

20 A 4P

Onderzoek

Schémas/plans

Equipotentiale verbindingen

Fundamenten

Elektrische installatie

NOK

NOK

vóór 81

vanaf 81

Beschrijving van de installatie

3 x differentieel

13 x automaat

Aantal verdeelborden

2

Hoofd differentieelschakelaar

300mA - 40A - type A

DK Test van DSR

ΔI_n

Controle van de staat

NOK

Opgesteld materieel

NOK

beschermingsinrichtingen tegen directe aanraking

NOK

beschermingsinrichtingen tegen indirecte aanraking

NOK

beschermingsinrichtingen tegen overstroom

NOK

Type aardelektrode

Baar

Weerstand aardelektrode (Ω)

0

Isolement (M Ω)

< 0,5 MOhms

Opmerkingen

Het is niet uitgesloten dat bij een nacontrole bijkomende inbreuken worden vastgesteld bij voorleggen schema's..

Besluit

BESLUIT : NIET CONFORM

+32 2 726 64 04 info@atlascontrole.be http://www.atlascontrole.be TVA: BE0732536476

Atlas Controle

Chaussée De La Hulpe 181 box 1

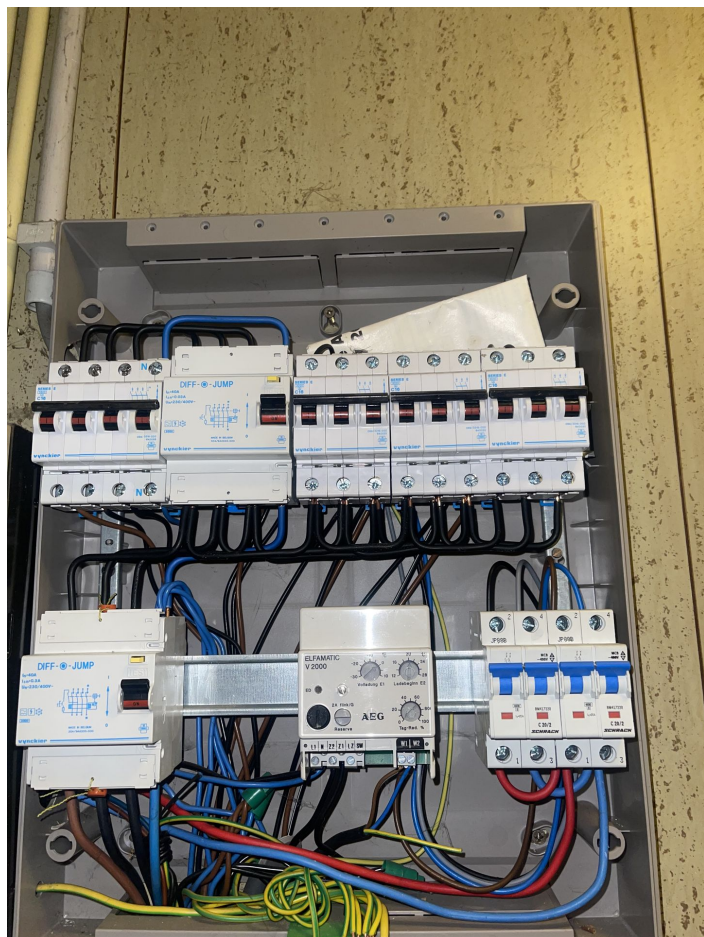
1170 Brussels

Belgium

De elektrische installatie voldoet niet aan de eisen van Boek 1 van de AREI (Koninklijk Besluit van 8/09/2019: C-2020/30795 + C-2020/30794) betreffende elektrische installaties met lage en zeer lage spanning. Een extra inspectie moet worden uitgevoerd door Atlas Contrôle vóór 1 jaar.

De werkzaamheden die nodig zijn om de tijdens het inspectiebezoek geconstateerde inbreuken ongedaan te maken, moeten onverwijld worden uitgevoerd en alle passende maatregelen moeten worden genomen om ervoor te zorgen dat de inbreuken, in geval van voortzetting van de exploitatie van de installaties, geen gevaar voor personen en goederen opleveren.

Handtekening van de inspecteur

Verdeelborden 1



Verdeelborden 2

Lijst inbreuken

Bewoordingen

Paragraaf

Atlas Contrôle

Chaussée De La Hulpe 181 box 1

1170 Brussels

Belgium

Bewoordingen	Paragraaf
De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm.	B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.
De aansluitingen van de hoofd-equipotentiaalverbindingen (water-, gasleiding, vertrek- en terugvoerleiding van verwarming) dienen vervolledigd te worden.	B1: 4.2.3.2.; B3: 4.2.3.2.
Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien.	B1: 3.1.2.; 9.1.1; 9.1.2; B3: 3.1.2.
Situatieschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien.	B1: 9.1.2.
De nominale spanning dient duidelijk vermeld te worden op een oordeelkundig gekozen plaats.	
Pictogram "levensgevaar" dient op degelijke wijze aangebracht te worden.	
De beschermingsgeleider (PE) over de hele installatie verdelen.	B1: 4.2.4.3.; 5.4.3.6.; B3: 5.4.3.6.
De niet-gebruikte leidingen verwijderen of aan de uiteinden isoleren.	
Schakelaar, contactdoos of aftakdoos herschikken en/of opnieuw bevestigen.	
Refixer les prises	
Aardingsonderbreker ontbreekt of is moeilijk/niet bereikbaar. De aardspreadsweerstand kon niet gemeten worden. Deze dient bij voorkeur kleiner te zijn dan 30ohm.	

Opmerkingen lijst

Bewoordingen	Referentie
De schema's van de elektrische installatie moeten in het elektrische installatiedossier bewaard worden. Het wordt ook ten zeerste aanbevolen een kopie van de schema's in de buurt van het hoofdverdeelbord te bewaren.	RDE2
Deze controle is beperkt tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie. Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.	RDE4
Deze inspectie is enkel beperkt tot de delen van de elektrische installatie die op de overeenkomstige (en ondertekende) delen van de schema's aangegeven zijn.	RDE5
Het is niet uitgesloten dat bij de presentatie van de schema's nog andere inbreuken vastgesteld zullen worden.	RDE12
